



# **IZVJEŠĆE O PROVEDBI OKOLIŠNIH I DRUŠTVENIH MJERA ZA DOSAD PROVEDENE RADOVE**

**ZA NOVI ODJEL PEDIJATRIJSKE HEMATOLOGIJE I  
ONKOLOGIJE KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA  
ZAGREB**

**Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti  
javnog zdravstva – Zajam br.: 9127HR (P173998)**

## SADRŽAJ

SAŽETAK .....	1
1. UVOD .....	2
1.1 Pozadina projekta.....	2
1.2 Svrha i cilj kontrole provedbe okolišnih i društvenih mjera za dosad provedene radove .....	3
2 PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR.....	5
2.1 Nacionalno zakonodavstvo vezano za okolišna i društvena pitanja .....	5
2.2 Pregled Okolišnih i društvenih standarda Svjetske banke (ESS) .....	6
3 OPIS POTPROJEKTA I AKTIVNOSTI.....	8
3.1 Pozadinske informacije.....	8
3.2 Tehnički opis .....	13
4 TRENUTNO STANJE AKTIVNOSTI .....	15
5 IZVJEŠTAJ O PROVEDBI OKOLIŠNIH I DRUŠTVENIH MJERA ZA DOSAD IZVRŠENE RADOVE.....	17
5.1 Metodologija.....	17
5.2 Obilazak lokacije .....	17
5.3 Zapažanja o okolišnim i društvenim pitanjima.....	19
5.4 Konzultacije s javnošću .....	19
5.5 Usklađenost dosad provedenih aktivnosti s Okvirom za okolišna i društvena pitanja (ESF).....	21
5.6 Zaključak .....	32
6 PRILOZI .....	33
6.1 PRILOG 1 – Plan uključivanja dionika potprojekta.....	33
6.2 PRILOG 2 – Rezultati ankete .....	40
6.3 PRILOG 3 – Pregled diskutiranih pitanja s javnog predstavljanja projekta.....	49

IZVJEŠĆE O PROVEDBI OKOLIŠNIH I DRUŠTVENIH MJERA ZA DOSAD PROVEDEN RADOVE  
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb  
**Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (P173998)**

---

## KRATICE

Kratice	Puni naziv
KBC	Klinički bolnički centar
E&S	Okolišni & društveni
EHSG	Smjernice Svjetske banke za zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost (eng. <i>World Bank Group Environmental, Health, and Safety Guidelines</i> )
EPR	Plan pripravnosti i odgovora na hitne slučajeve (eng. <i>Emergency preparedness and response plan</i> )
ESF	Okolišni i društveni okvir (eng. <i>Environmental and Social Framework</i> )
ESMF	Okvir za upravljanje okolišnim i društvenim rizicima (eng. <i>Environmental and Social Management Framework</i> )
ESMP	Plan upravljanja okolišnim i društvenim rizicima (eng. <i>Environmental and Social Management Plan</i> )
ESS	Okolišni i društveni standardi Svjetske banke (eng. <i>Environmental and Social Standards</i> )
GRM	Žalbeni mehanizam (eng. <i>Grievance Redress Mechanism</i> )
GIIP	Dobra međunarodna industrijska praksa (eng. <i>Good International Industry Practice</i> )
MPGI	Ministarstvo prostornog uređenje, graditeljstva i državne imovine
NN	Narodne novine
ZNR	Zaštita na radu
OZO	Osobna zaštitna oprema (eng. <i>PPE - Personal Protective Equipment</i> )
SB	Svjetska banka
SEA	Spolno iskorištavanje i zlostavljanje (eng. <i>Sexual Sexual Exploitation and Abuse</i> )
SH	Spolno uznemiravanje (eng. <i>Sexual Harassment</i> )
SZO	Svjetska zdravstvena organizacija

## SAŽETAK

Svjetska banka (SB) pruža podršku Vladi Republike Hrvatske u provedbi Projekta obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva u Hrvatskoj (Zajam-9127HR). U okviru Projekta, Svjetska banka podupire Republiku Hrvatsku u naporima obnove nakon potresa u Gradu Zagrebu te Zagrebačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji, poboljšanju institucionalnih kapaciteta za obnovu i jačanju nacionalnih sustava za javnozdravstvenu pripravnost. Izgradnja novog Odjela pedijatrijske hematologije i onkologije financira se putem ovog Zajma te spada pod podkomponentu 1.2. Projekta.

Cilj ovog Izvješća o provedbi okolišnih i društvenih mjera za dosad provedene radove (u daljnjem tekstu: Izvješće) je da se pruže dokazi, prihvatljivi Svjetskoj banci, da su dosad izvršeni radovi bili izvedeni u skladu s nacionalnom legislativom, Okolišnim i društvenim okvirom Svjetske banke (ESF), kao i Smjernicama za zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost (ESHG).

Glavni rezultati provedene analize:

- Do sada izvedeni radovi i usluge na izgradnji novog Odjela za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju uključuju izradu glavnog i Izvedbenog projekta, koji predviđaju građevinske radove samo do određenog stupnja dovršenosti, građevinske radove definirane navedenim uslugama izrade projektne dokumentacije i nadzor radova. Građevinski radovi izvođeni su tijekom 2019., 2020. i 2021. godine. Potresi koji su se dogodili u Hrvatskoj 2020. i 2021. godine nisu uzrokovali oštećenja na objektu ili izvedenim radovima. Navedeni radovi nisu predmet retroaktivnog financiranja kroz ovaj Zajam 9127HR.
- Zbog sporadičnog izvođenja radova tijekom godina, višestrukih ugovora o radovima i odsutnosti upravljanja projektom, informacije o načinu provedbe mjera zaštite okoliša i zaštite okoliša djelomično su nedostupne.
- Građevinski otpad preuzele su ovlaštene tvrtke 3KF d.o.o. i Ce-Za-R d.o.o. i predale na daljnju uporabu u skladište 3KF d.o.o. za otkup metalnog otpada, papira i kartona u Čulinečkoj 218 i reciklažnom centru Cezar Sesvete u Industrijskoj. 36, Sesvete. Prilikom svakog odvoza izdan je Prateći list za otpad.
- Tijekom izvođenja radova nisu zabilježene nesreće i ozljede. Provedene su mjere zaštite na radu, a provedbu je pratio pružatelj usluga nadzora.
- Svi građevinski radnici primili su novčanu nadoknadu za svoj rad, nije bilo prisilnog rada. Izrada tehničke dokumentacije (uključujući sve potrebne daljnje izmjene do ishoda pravomoćne uporabne dozvole); izdavanje građevinske dozvole; izmjene i dopune građevinske dozvole; izrada projektne dokumentacije izvedenog stanja i projektantskog nadzora darovane su potpuno dobrovoljno, bez prisile i niti jedan donator zbog toga nije osiromašen.
- Zemljište i zgrada na kojoj se nalazi novi Odjel za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju u vlasništvu je Kliničkog bolničkog centra Zagreb i nema neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.
- Nisu identificirane nikakve pridružene ustanove novom Odjelu za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju.
- Iako nije uspostavljen formalni mehanizam pritužbi tijekom izvođenja radova, pritužbe su se mogle podnijeti Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Nije bilo pritužbi.

## 1. UVOD

### 1.1 Pozadina projekta

Svjetska banka pruža podršku Vladi Republike Hrvatske u provedbi Projekta obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva u Hrvatskoj (Zajam br. 9127HR). U okviru Projekta, Svjetska banka podupire Republiku Hrvatsku u naporima obnove nakon potresa u Gradu Zagrebu te Zagrebačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji, poboljšanju institucionalnih kapaciteta za obnovu i jačanju nacionalnih sustava za javnozdravstvenu pripravnost. Komponenta 1: Oporavak i obnova nakon potresa, Podkomponenta 1.2: Sanacija i rekonstrukcija zdravstvenih i obrazovnih ustanova definira način obnove i druge mjere i aktivnosti obnove oštećenih zdravstvenih i obrazovnih ustanova u javnom vlasništvu. Sukladno pravnom sporazumu, zdravstvena i obrazovna ustanova je zgrada, dio zgrade ili prostor povezan sa zgradom koji se koristi u zdravstvene i/ili obrazovne svrhe u Zagrebu i okolici. Projekt promovira pristup „*Build Back Better*“, koji uključuje poboljšanja standarda dizajna, kvalitete gradnje i funkcionalnosti. Integracijom seizmičkih aspekata i aspekata klimatskih promjena u infrastrukturne projekte investicija dodatno će poboljšati otpornost infrastrukture na buduće katastrofe i klimatske rizike te pomoći zaštititi ljudskih života i imovine, pridonoseći pritom prilagodbi klimatskim promjenama i ublažavanju utjecaja na klimatske promjene. Sve građevinske aktivnosti odvijat će se unutar gabarita postojećih zgrada. “Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva” sastoji se od sljedećih projektnih komponenti i podkomponenti (tablica 1).

Tablica 1. Komponente i podkomponente projekta

<b>Komponenta 1: Oporavak i obnova nakon potresa</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Podkomponenta 1.1: Budžet za nepredviđene situacije za podkomponentu 1.2</li><li>• Podkomponenta 1.2: Sanacija i rekonstrukcija zdravstvenih i obrazovnih ustanova</li><li>• Podkomponenta 1.3: Javna infrastruktura (u zdravstvu i obrazovanju) i institucionalna podrška za planiranje ulaganja/provedbu oporavka i obnove</li></ul>
<b>Komponenta 2: Nadzor i pripravnost javnog zdravstva</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Podkomponenta 2.1: Upravljanje pojedinim slučajevima i nadzor</li><li>• Podkomponenta 2.2: Pripremljenost javnog zdravstva</li></ul>
<b>Komponenta 3: Upravljanje projektom</b>

Novi Odjel dječje hematologije i onkologije spada pod Podkomponentu 1.2. U sklopu Podkomponente 1.2. financira se provedba detaljnog inženjerskog pregleda odabranih građevina koje se koriste u zdravstvene i obrazovne svrhe i koje su oštećene u potresu, nakon čega slijedi sanacija i obnova odabranih javnih zgrada kako bi se obnovila sposobnost zemlje da pruži ključne javne zdravstvene i obrazovne usluge. To uključuje sanaciju građevina, rušenje nesigurnih javnih zgrada i izgradnju novih javnih zgrada na istoj lokaciji kako bi se zamijenile oštećene zgrade. Zahvati moraju biti u skladu sa zahtjevima Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 102/20, 10/21, 117/21) te podzakonskih akata i standarda na koje ovaj Zakon upućuje. Radovi će biti nadopunjeni funkcionalnim nadogradnjama i dizajnom otpornim na klimu, uključujući poboljšanu izolaciju za suočavanje s ekstremnom temperaturom i energetska učinkovitost kako bi se također riješili rizici povezani s klimatskim promjenama. Funkcionalne nadogradnje bit će orijentirane na zdravlje i sigurnost (npr. kako bi se osigurala prihvatljiva kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru, zaštita od požara, otpornost na potrese, itd.), kao i rodno informirane, uključujući



odgovarajuća razmatranja za osobnu sigurnost i higijenu te podržavati osobe s invaliditetom kako bi se osigurala univerzalna pristupačnost, uzimajući u obzir povratne informacije prikupljene kroz javne konzultacije. Mjere energetske učinkovitosti, kao što su odgovarajuća izolacija, energetske učinkovite prozori, LED svjetla, bijeli krovovi i solarni paneli, pomoći će u smanjenju klimatskog otiska zdravstvenih i obrazovnih ustanova i smanjiti operativne troškove za Vladu. Projektne aktivnosti također će uključivati zamjenu i nadogradnju opreme prema potrebi.

## **1.2 Svrha i cilj kontrole provedbe okolišnih i društvenih mjera za dosad provedene radove**

Odjel za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju Kliničkog bolničkog centra (KBC) Zagreb referentni je centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske što znači da je to jedina bolnica u Hrvatskoj u kojoj se provodi alogena transplantacija koštane srži. Odjel je mjesto za liječenje svih vrsta bolesti krvi i malignih bolesti kod djece do 18 godina, a najviše se liječe leukemije i limfomi. Nadalje, provode se sve vrste suvremenog liječenja malignih bolesti djece, kao što su megakemoterapija, terapija monoklonskim antitijelima i dr.

Sadašnji Odjel za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju nalazi se u prizemlju glavne zgrade Kliničkog bolničkog centra (KBC) Zagreb. Trenutna lokacija je, nažalost, krajnje neprikladna. Ispod prozora južnih dijelova odjeljenja nalaze se ventilacijski kanali iz klima i travnate površine, što pridonosi većoj učestalosti gljivičnih infekcija. Uz sjeverni dio odjeljenja prolazi glavna cesta koja vodi do središnje zgrade. Vanjska buka stalno ometa odmor djece, a često im smetaju i znatizeljni pogledi s ulice. Sustav klimatizacije odjela je neprikladan. Također, jedan toalet koriste korisnici 2 do 3 sobe, što je epidemiološki neprihvatljivo s obzirom na imunokompromitiranost ovih bolesnika. Konačno, ne postoji mogućnost za roditelje da provedu cijeli dan s djetetom. Alogena transplantacija hematopoetskih stanica (koštane srži) smatra se najsloženijim zahvatom u pedijatrijskoj onkologiji. Trenutno se godišnje u KBC-u Zagreb obavi oko 15 transplantacija. S druge strane, 4 trenutno dostupne jedinice obrnute izolacije pružaju vrlo ograničen prostor. Nadalje, novi izazov u liječenju je i "terapija CAR T stanicama". Iako je osoblje odjela prošlo odgovarajuću obuku za uspješno izvođenje ovog obećavajućeg postupka u europskim centrima, potrebni uvjeti nisu se mogli osigurati u postojećim prostorijama.

Potres je uzrokovao manja oštećenja na pregradnim zidovima i spušenim stropovima, tako da nije bilo ograničenja u korištenju glavne zgrade, uključujući i Odjela za dječju hematologiju i onkologiju. Stoga se nastavilo s korištenjem tih prostora. Glavna zgrada pripada IV. razredu važnosti za građevine prema HRN EN 1998, čija je cjelovitost u slučaju potresa od vitalnog značaja za civilnu zaštitu. Trenutačno konstrukcija glavne zgrade zadovoljava II razred, no cjelovitom obnovom postići će se IV. razred. Procesom ojačanja konstrukcije (novi armirano-betonski zidovi) dodatno će se smanjiti prostor sadašnjeg odjela, koji je ionako nedostatan za adekvatno pružanje usluga, kako je prethodno navedeno. Gradilište za rekonstrukciju glavne zgrade bit će postavljeno (formalno i operativno). Potporne konstrukcije uključujući skele, potporne grede itd., ali ne ograničavajući se na njih, a bit će postavljene gdje je to potrebno (sve u skladu s nacionalnim propisima iz ZNR za građevinske radove, WB ESS2 i WB EHS2). Vrijeme ojačavanja stabilnosti glavne zgrade pomno će se pratiti u odnosu na vrijeme početka radova na Odjelu pedijatrijske hematologije i onkologije - radovi će se izvoditi nakon stabilizacije zgrade (s potpornom konstrukcijom koja će se koristiti za radove na stabilnosti zgrade), dok će korištenje novog Odjela pedijatrijske hematologije i onkologije započeti nakon završetka rekonstrukcije glavne zgrade (dilatacija ispod novog Odjela pedijatrijske hematologije i onkologije).

Prema Okolišnom i društvenom okviru (ESF) Svjetske banke, svi radovi na projektima koje financira Svjetska banka (uključujući one koji su provedeni prije uključivanja Svjetske banke) moraju biti u skladu s primjenjivim zahtjevima ESS-a.

Cilj ovog Izvješća je da se pruže dokazi, prihvatljivi Svjetskoj banci, da su dosad izvršeni radovi bili izvedeni u skladu s nacionalnom legislativom, Okolišnim i društvenim okvirom Svjetske banke (ESF), Dobrom međunarodnom industrijskom praksom (GIIP) kao i Smjernicama za zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost Svjetske banke (ESHG) te da dugoročna održivost potprojekta nije ugrožena kao rezultat provedbe aktivnosti. Zahtjevi okolišnih i društvenih standarda uključuju, ali nisu ograničeni na to da:

- nije došlo do značajnih nesreća, ozljeda ili smrtnih slučajeva kao posljedica nepoštivanja mjera zaštite na radu, Izvođač je proveo sve potrebne obuke, certifikate, dobivene su dozvole, postoji odgovarajuća kompetencija za zaštitu na radu te su ispunjeni ostali regulativni i ESF zahtjevi tijekom dosad izvršenih građevinskih radova;
- nema značajnih pritužbi zajednice/pacijenata/zaposlenika i negativnih utjecaja kao rezultat provedbe potprojekta;
- je moguće utvrditi konačno mjesto odlaganja otpada (putem otpremnica otpada, ugovora s ovlaštenom tvrtkom, drugih dokumenata), itd.

## 2 PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR

### 2.1 Nacionalno zakonodavstvo vezano za okolišna i društvena pitanja

Sljedeći najrelevantniji nacionalni propisi iz područja zaštite okoliša definiraju pravni okvir upravljanja okolišem (tablica 2)

Table 2. Hrvatski propisi iz područja zaštite okoliša

Zakon	Relevantnost za podprojekt
<b>Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)</b>	Relevantno s aspekta zaštite okoliša. Prema Zakonu, pri planiranju i izvođenju zahvata moraju se primijeniti sve utvrđene preventivne mjere zaštite okoliša, kako bi se izbjegli rizici i opasnosti za okoliš. Potencijalni rizik za okoliš može se očekivati tijekom izgradnje i korištenja.
<b>Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)</b>	Nije relevantan. Podprojekt se ne nalazi unutar niti u blizini zaštićenih područja prirode niti područja Natura 2000.
<b>Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)</b>	Relevantan s aspekta gospodarenja otpadom. Njime se osigurava okvir za provedbu mjera zaštite okoliša i zdravlja ljudi sprječavanjem ili smanjenjem stvaranja otpada, smanjenjem negativnih učinaka stvaranja otpada i gospodarenja otpadom, smanjenjem ukupnih učinaka korištenja sirovina i poboljšanjem učinkovitosti korištenja sirovina te povećanje recikliranja i ponovne uporabe, što je nužno za prijelaz na kružno gospodarstvo. Tijekom izgradnje i korištenja očekuje se stvaranje otpada.
<b>Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19)</b>	Relevantan s aspekta kvalitete zraka. Njime se daje okvir za provedbu mjera zaštite zraka, kao i sprječavanje i smanjenje onečišćenja zraka. Tijekom izgradnje očekuje se potencijalni utjecaj na kvalitetu zraka.
<b>Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21)</b>	Relevantan s aspekta kvalitete vode. On pruža okvir za postizanje i održavanje dobrog stanja voda u cilju zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite njihove imovine i zaštite vodenih ekosustava i ekosustava ovisnih o vodi. Također, uređuje korištenje voda za javnu vodoopskrbu te ispuštanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Potencijalni utjecaj na površinske i podzemne vode očekuje se tijekom izgradnje i korištenja.
<b>Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/32, 41/21)</b>	Relevantan s aspekta energetske učinkovitosti zgrade. Pruža okvir za poboljšanje energetske učinkovitosti i provedbu mjera energetske učinkovitosti u građevinskom sektoru. Projekt zgrade mora uzeti u obzir sve relevantne i moguće mjere energetske učinkovitosti.
<b>Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)</b>	Relevantan s aspekta ljudskog zdravlja. On pruža okvir za uspostavljanje mjera za izbjegavanje, sprječavanje ili smanjenje štetnih učinaka na ljudsko zdravlje koji uzrokuje buka u okolišu. Tijekom izgradnje može se očekivati povećana razina buke.
<b>Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18 21/22)- pravilnik koji iz njega proizlazi: Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje</b>	Relevantan s aspekta zdravlja ljudi zbog izloženosti ionizirajućem zračenju. Njime se određuju uvjeti kojima moraju udovoljavati prostor i uređaji u kojima se nalaze izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavljaju djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, posebna pravila zaštite od ionizirajućeg zračenja ili sprječavanja širenja radioaktivnog onečišćenja u području posebnog nadleganja i način kontrole i/ili ograničenja pristupa istom, uvjete za projektiranje, građenje, uporabu i razgradnju građevina u kojima se nalaze izvori ionizirajućeg zračenja.



Zakon	Relevantnost za podprojekt
<b>djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 53/18, 6/22)</b>	
<b>Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)</b>	Relevantan s aspekta ljudskog zdravlja. On daje okvir za uspostavljanje i provedbu mjera zaštite od požara. Svaka fizička i pravna osoba dužna je postupati na način da ne može izazvati požar, kao i provoditi mjere zaštite od požara. Moguća opasnost od požara može se očekivati tijekom izgradnje i korištenja.
<b>Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)</b>	Prema zakonu, zgrada mora biti projektirana i izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju higijeni ili zdravlju i sigurnosti radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu. Također mora biti projektiran i izgrađen na način da osigurava sigurnost i pristupačnost tijekom korištenja, zaštitu od buke, energetska učinkovitost i održivo korištenje prirodnih resursa.

Što se tiče nacionalnog zakonodavstva vezano za društvena pitanja, valja istaknuti da je pravo na jednakost i nediskriminaciju temeljno ljudsko pravo zaštićeno Ustavom Republike Hrvatske. Osim toga, i sljedeći zakoni uređuju društvena i socijalna pitanja:

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11, 93/11);
- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22);
- Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17);
- Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12);
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18);
- Zakon o strancima (NN 133/20);
- Zakon o državljanima država članica EGP-a i članovima njihovih obitelji (NN 66/19, 53/20, 144/20).

Detaljniji opis zakonodavstva koje uređuje okolišna i društvena pitanja detaljnije je razrađen u Okviru za upravljanje okolišnim i društvenim pitanjima (eng. *Environmental and Social Management Framework (ESMF)*).<sup>1</sup>

## 2.2 Pregled Okolišnih i društvenih standarda Svjetske banke (ESS)

Svjetska banka razvila je Okolišni i društveni okvir (ESF) u kojem se utvrđuje predanost Svjetske banke održivom razvoju kroz primjenu Politike Banke (definirane u ESF-u) i skupa okolišnih i društvenih standarda (eng. *Environmental and Social Standards (ESS)*) koji su osmišljeni kao podrška Zajmoprimcima projekata, s ciljem iskorjenjivanja ekstremnog siromaštva i promicanja zajedničkog prosperiteta.

Okolišni i društveni standardi Svjetske banke utvrđuju obvezne zahtjeve koji se odnose na Zajmoprimca i projekte. Predstavljaju skup obveznih smjernica i uputa s glavnim ciljem poticanja učinkovite identifikacije i ublažavanja potencijalno nepovoljnih utjecaja na okoliš i društvo koji se mogu pojaviti u razvojnim projektima, uz odgovarajući angažman dionika i održivo upravljanje. Okolišni i društveni standardi Svjetske banke (ESS), zajedno sa Smjericama za zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost (ESHG) i Dobrom međunarodnom

1

[https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Potres/Svjetska%20banka//ESMF Component 1 January%202022.pdf](https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Potres/Svjetska%20banka//ESMF%20Component%201%20January%202022.pdf)

industrijskom praksom (GIIP) koji su također obvezni prema ESF-u, primjenjuju se paralelno s nacionalnim zakonodavstvom po principu primjene strožih pravila.

Postoji 10 ESS-ova, a svaki postavlja niz ciljeva<sup>2</sup>. Ciljevi opisuju ishode koje svaki od ESS-ova namjerava postići.

Sljedeći ESS-ovi relevantni su za ovaj potprojekt:

- ESS1 Procjena i upravljanje okolišnim i socijalnim rizicima i utjecajima;
- ESS2 Uvjeti zapošljavanja i rada;
- ESS3 Efikasno korištenje resursa te sprječavanje i upravljanje onečišćenjem;
- ESS4 Zdravlje i sigurnost zajednice;
- ESS10 Uključivanje dionika i objava informacija.

Sljedeći ESS-ovi nisu relevantni za ovaj potprojekt:

- ESS5 Otkup zemljišta, ograničenja korištenja zemljišta i prisilno preseljenje
  - ovaj standard nije relevantan jer nema otvorenih pitanja u vezi s vlasništvom nad zemljištem;
- ESS6 Očuvanje bioraznolikosti i održivo upravljanje živim prirodnim resursima:
  - ovaj standard nije relevantan budući da se lokacija potprojekta ne nalazi unutar niti u blizini zaštićenih područja prirode niti područja Natura 2000 i ne očekuje se da će potprojekt imati utjecaja na žive prirodne resurse;
- ESS7 Domorodci / tradicionalne lokalne zajednice sub-saharske Afrike koje prije nisu imale dovoljan pristup uslugama:
  - ovaj standard nije relevantan jer Hrvatska nema jasne etničke, društvene i/ili kulturne skupine koje pokriva ESS7;
- ESS8 Kulturna baština:
  - ovaj potprojekt se ne nalazi unutar zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina i područja prepoznatih kao vrijedna za zajednicu;
- ESS9 Financijski posrednici:
  - Ovaj standard nije primjenjiv jer projekt ne predviđa uključivanje financijskih posrednika.

---

<sup>2</sup> Detaljniji opis ESS-ova dan je u Okviru za upravljanje okolišnim i društvenim pitanjima (eng. *Environmental and Social Management Framework*).

[https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Potres/Svjetska%20banka//ESMF\\_Component\\_1\\_January%202022.pdf](https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Potres/Svjetska%20banka//ESMF_Component_1_January%202022.pdf)

### 3 OPIS POTPROJEKTA I AKTIVNOSTI

Opće informacije o potprojektu navedene su u tablici 3.

Tablica 3. Opće informacije – potprojekt - novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije

<b>Naziv potprojekta</b>	Izgradnja novog Odjela pedijatrijske hematologije i onkologije
<b>Svrha</b>	Novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije
<b>Korisnik</b>	Klinički bolnički centar Zagreb
<b>Lokacija (adresa, grad/općina, županija)</b>	Ulica Mije Kišpatića 12, 10000 Zagreb
<b>Katastarska čestica i općina</b>	Katastarska čestica br. 3490/1, katastarska općina Maksimir
<b>Vlasnik čestice</b>	Klinički bolnički centar Zagreb
<b>Postoje li “povezani objekti/aktivnosti” (eng. <i>Associated Facilities</i>)<sup>3</sup> u odnosu na potprojekt?</b>	NE
<b>Je li potprojekt usklađen s prostorno-planskom dokumentacijom?</b>	DA IV Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Zagreba (Službene novine br. 8/01, 16/02, 11/03, 2/06, 1/09, 8/09, 21/14, 23/14 i 22/17) IV Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba (Službene novine br. 16/07, 8/09, 7/13 i 9/16)
<b>Predstavlja li potprojekt zaštićeno kulturno dobro?</b>	NE
<b>Nalazi li se potprojekt unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline?</b>	NE
<b>Nalazi li se potprojekt unutar zaštićenih područja prirode ili područja ekološke mreže (Natura 2000 područja)?</b>	NE

#### 3.1 Pozadinske informacije

Sadašnji Odjel za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju smješten je u prizemlju glavne zgrade Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Novi Odjel za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju smješten je na trećem i četvrtom katu glavne zgrade (slike 1, 2 i 3).

<sup>3</sup> Prema okolišnim i društvenim standardima Svjetske banke (ESS), izraz “povezani objekti/aktivnosti” odnosi se na objekte ili aktivnosti koje se ne financiraju kao dio projekta, ali su: (a) izravno i značajno povezani s projektom; i (b) provedeni ili se planiraju provoditi istovremeno s projektom; te su (c) potrebni da bi projekt bio realiziran te ne bi bili izgrađeni, prošireni ili provedeni bez projekta. Da bi se objekti ili aktivnosti identificirali kao “povezani objekti/aktivnosti”, moraju ispunjavati sva tri gore navedena kriterija. Povezani objekti/aktivnosti trebaju ispunjavati zahtjeve ESS-ova, u mjeri u kojoj Zajmoprimac ima kontrolu ili utjecaj na takve povezane objekte/aktivnosti



IZVJEŠĆE O PROVEDBI OKOLIŠNIH I DRUŠTVENIH MJERA ZA DOSAD PROVEDEN RADOVE  
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb  
**Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (P173998)**

---



*Slika 1. Lokacija novog Odjela za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju - pogled na glavnu zgradu iz zraka*



*Slika 2. Lokacija novog Odjela za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju – shematski na tlocrtu*



Slika 3. Lokacija novog Odjela za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju – vizualizacija

Na trećoj etaži nalazi se tehnički prostor – sprinkler ventilna stanica i hidrostanica, evakuacijski hodnik, garderoba, soba za sastanke i spremište. Na četvrtom katu nalaze se bolesničke sobe, radni prostori, društvene prostorije, pomoćne prostorije i kupaonice.

Glavnim projektom predviđena je izgradnja do određenog stupnja dovršenosti koja uključuje kompletnu nosivu konstrukciju, stupove, grede, ploču, stepenice, lift, krovnu konstrukciju, fasadu i instalacije što je u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), članak 114.

U Tablici 4. prikazana je pripremljena dokumentacija te izdane dozvole (do kolovoza 2022.) u procesu realizacije potprojekta.

Tablica 4. Pripremljena dokumentacija i izdane dozvole (do kolovoza 2022)

Obavezni dokumenti/dozvole	Status	Godina	Napomena
Idejni projekt	DA	ožujak 2018	-
Posebni uvjeti gradnje	DA	svibanj 2018	<p>Posebni uvjeti gradnje dobiveni u redovnom postupku ishoda građevinske dozvole. Dobiveni su sljedeći posebni uvjeti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanitarno-tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od buke</li> <li>• Posebni uvjeti vezani uz prostorno planiranje</li> <li>• Posebni uvjeti za priključenje na elektroenergetsku mrežu</li> <li>• Posebni uvjeti priključenja na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu</li> </ul>



IZVJEŠĆE O PROVEDBI OKOLIŠNIH I DRUŠTVENIH MJERA ZA DOSAD PROVEDEN RADOVE  
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb  
**Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (P173998)**

Obavezni dokumenti/dozvole	Status	Godina	Napomena
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posebni uvjeti priključenja na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu</li> </ul>
<b>Glavni projekt</b>	DA	svibanj 2018	<p>Izrađen je Glavni projekt. Uključuje sljedeće mape:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mapa 1: Glavni arhitektonski projekt</li> <li>• Mapa 2: Glavni strojarski projekt vodovodnih instalacija i hidrantske mreže</li> <li>• Mapa 3: Glavni građevinski projekt</li> <li>• Mapa 4: Glavni projekt električnih instalacija</li> <li>• Mapa 5: Glavni projekt sustava dojava požara</li> <li>• Mapa 6: Glavni projekt sprinkler instalacija</li> <li>• Mapa 7: Glavni strojarski projekt – projekt vertikalnog transporta</li> </ul> <p>Također, dio Glavnog projekta je i sljedeći elaborat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborat zaštite od požara - u skladu s austrijskim smjernicama TRVB 126 (Tehničke smjernice za preventivnu zaštitu od požara), smjernicama njemačkih osiguravajućih društava VdS CEA 4001 (Smjernice za sprinkler sustave) ili hrvatskim smjernicama (HRN – EN 12845).</li> </ul>
<b>Građevinska dozvola</b>	DA	kolovoz 2018	Građevinska dozvola izdana je 9. kolovoza 2018.
<b>Izvedbeni projekt</b>	DA	prosinač 2020	<p>Izrađen je Izvedbeni projekt. Uključuje sljedeće mape:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mapa 1: Izvedbeni arhitektonski projekt</li> <li>• Mapa 2: Izvedbeni građevinski projekt</li> <li>• Mapa 3: Elektrotehnički projekt električnih instalacija</li> <li>• Mapa 4: Izvedbeni elektrotehnički projekt sustava bolničke signalizacije</li> <li>• Mapa 5: Izvedbeni elektrotehnički projekt sustava tehničke zaštite</li> <li>• Mapa 6: Izvedbeni elektrotehnički projekt sustava za dojavu požara</li> <li>• Mapa 7: Izvedbeni elektrotehnički projekt sprinkler instalacija</li> <li>• Mapa 8: Izvedbeni projekt vodovoda, odvodnje i hidrantske mreže</li> <li>• Mapa 9: Izvedbeni projekt grijanja, hlađenja i ventilacije</li> <li>• Mapa 10: Izvedbeni projekt razvoda medicinskih plinova</li> <li>• Mapa 11: Izvedbeni projekt medicinske i nemedicinske opreme</li> </ul> <p>Također, dio Izvedbenog projekta je i sljedeći elaborat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborat zaštite od požara - u skladu s austrijskim smjernicama TRVB 126 (Tehničke smjernice za preventivnu zaštitu od požara), smjernicama njemačkih osiguravajućih društava VdS CEA 4001</li> </ul>

IZVJEŠĆE O PROVEDBI OKOLIŠNIH I DRUŠTVENIH MJERA ZA DOSAD PROVEDEN RADOVE  
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb  
**Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (P173998)**

Obavezni dokumenti/dozvole	Status	Godina	Napomena
			(Smjernice za sprinkler sustave) ili hrvatskim smjernicama (HRN – EN 12845) završen 11/2020.
<b>Elaborat procjene oštećenja nakon potresa (glavna zgrada)</b>	DA	ožujak 2020	Zaključak prvog pregleda stabilnosti bio je da je potres uzrokovao manja oštećenja na pregradnim zidovima i spušenim stropovima, tako da nema ograničenja za sigurno korištenje zgrade.
<b>Elaborat procjene oštećenja nakon potresa (glavna zgrada)</b>	DA	travanj 2021	Tijekom izrade Elaborata procjene oštećenja nakon potresa provedene su navedene aktivnosti i analize: <ul style="list-style-type: none"> <li>• obavljen je tehnički terenski pregled kako bi se potvrdila seizmička procjena konstrukcija i nedostataka povezanih s odabranim građevinama;</li> <li>• revidirana je postojeća građevinska dokumentacija kao i postojeći podaci o opasnostima i karte;</li> <li>• prikupljeni su i analizirani nacrti izvedenog stanja (građevinski, arhitektonski) kako bi se utvrdile karakteristike građevina;</li> <li>• definirane su relevantne pretpostavke za sve podatke koji nedostaju;</li> <li>• pregledana je projektna dokumentacija i izvješća nedavnih inspekcija/procjena građenja;</li> <li>• proračunima, analizama i opažanjima procijenjena je otpornost zgrade;</li> <li>• razvijene su sheme naknadnog opremanja za ostvarenje potrebne otpornost;</li> <li>• razrađena je potrebna razina seizmičke sanacije i očekivani zahvati na građevini s tehničkim rješenjima i smjernicama za izradu tehničke dokumentacije za cjelovitu obnovu građevine;</li> <li>• izrađene su procjene troškova za rekonstrukciju i povezane radove.</li> </ul>
<b>Elaborat procjene oštećenja nakon potresa (novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije)</b>	DA	lipanj 2022	Zaključak pregleda stabilnosti bio je da potresi koji su se dogodili u Hrvatskoj 2020. i 2021. godine nisu prouzročili štetu na konstrukciji ili obavljenim radovima.
<b>Troškovnik</b>	DA	lipanj 2022	Izrađen na temelju izvedbenog projekta i ulaznih podataka za građevinske radove.
<b>Uporabna dozvola</b>	NE	-	Nije ishodaena.

Budući da je glavnim projektom predviđena izgradnja samo do određenog stupnja dovršenosti, potrebne su izmjene i dopune projektne dokumentacije. Također, potrebno je izdavanje izmjene i dopune građevinske dozvole. Zahtjev za ishodaenje izmjene i dopune građevinske dozvole predan je 13.12.2022.

### 3.2 Tehnički opis

Rekonstrukcija i nadogradnja novog Odjela za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju sastoji se od dvije etaže smještene na trećem i četvrtom katu sjevernog dijela glavne zgrade KBC-a Zagreb. Na trećoj etaži nalazi se tehnički prostor (sprinkler ventilna stanica i hidrostanica), evakuacijski hodnik i stubište te garderoba za medicinske sestre, prostorija za sastanke i spremište. Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije bit će smješten na četvrtom katu. Odjel će se sastojati od hodnika širine 245 cm duž kojeg će se nalaziti bolesničke sobe, radni prostori, društvene prostorije, pomoćne prostorije i sanitarni čvor. Svi sadržaji bit će smješteni unutar tri cjeline (zapadni, središnji i istočni dio podijeljeni volumenima postojeće građevine koji ujedno oblikuju i volumen cjeline).

Bolesničke sobe bit će jednokrevetne (14) i dvokrevetne (4) te sobe za izolaciju (6) s propusnikom i sanitarnim čvorovima u istočnom dijelu, odvojene od ostatka. Glavni ulaz u zgradu je sa zapadne strane, gdje se nalaze stubište i lift koji se nastavljaju iz nižih etaža. Dizalo je namijenjeno za evakuaciju osoba smanjene pokretljivosti. Na ulazu u odjel, odnosno na zapadnom dijelu, nalazit će se soba za roditelje sa sanitarnim čvorom (sjeverna strana) i pomoćnim prostorijama za pranje i dezinfekciju, medicinski i nemedicinski otpad, skladište prljavog rublja i prostorija za čisto rublje. Na južnoj strani će se nalaziti igraonice, škola i dnevni boravak s čajnom kuhinjom te kapelica. U istočnom dijelu, uz već spomenuti izolacijski blok i ostale bolesničke sobe, nalazit će se i prostorija za pripremu lijekova (sjever), ultrazvučna soba i liječnička soba sa sanitarnim čvorom (jug).

Na istočnoj strani odjela, na trećem i četvrtom katu, nalazi se već izgrađeni dio bolnice, isto tako i na južnoj strani. Lođe (4) su ostavljene kako južni dio postojeće građevine ne bi bio lišen prirodnog osvjjetljenja. S istočne strane odjel će se spojiti na već postojeću nadogradnju u „istočnom češlju“ u sklopu kojega je i dio Klinike za pedijatriju. Parking za zaposlenike i roditelje osiguran je na postojećem parkiralištu KBC-a Zagreb, budući da nema povećanja broja soba i broja zaposlenika u odnosu na postojeći odjel u prizemlju koji se ovom dogradnjom izmješta.

Postojećim glavnim projektom predviđena je izgradnja do određenog stupnja dovršenosti. Bit će projektirana kompletna nosiva konstrukcija (čelični stupovi i grede prema statičkom proračunu), stropna ploča između treće i četvrte etaže, čelično stubište između treće i četvrte etaže za evakuacijski hodnik, evakuacijski hodnik na trećoj etaži, lift i zapadno čelično stubište između trećeg i četvrtog kata te krovna konstrukcija i svi slojevi krovišta.

U daljnjoj razradi glavnog i izvedbenog projekta, u novoj mapi arhitekture, kao i u mapama ostalih ovlaštenih struka, prikazana su rješenja za daljnju razradu projekta do cjelokupne završenosti i privođenja prostora konačnoj namjeni (izrada nenosivih zidova od gipskartonskih ploča, završna obrada stubišta, potrebne završne podne i zidne obloge, spuštene stropovi, ugradnja opreme i sanitarnih čvorova, vrata i stijena, rasvjetnih tijela i ostalih instalacija).

Prikaz i usporedba postojećeg i projektiranog stanja dani su na slikama 4 i 5.



*Slika 4. Postojeće stanje glavne zgrade*



*Slika 5. Projektirano stanje glavne zgrade*



#### 4 TRENUTNO STANJE AKTIVNOSTI

Kao što je već navedeno, postojećom tehničkom dokumentacijom predviđena je izgradnja do određenog stupnja dovršenosti. Izvedeni su određeni građevinski radovi, a svi preostali radovi bit će predmet nabave koja je planirana u okviru ovog potprojekta. Nakon završetka preostalih radova, novi Odjel za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju bit će dovršen, preuzet od strane korisnika i spreman za korištenje. Korištenje novog Odjela za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju započet će nakon završetka rekonstrukcije glavne zgrade (građevinski dio ispod novog Odjela za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju).

Građevinski radovi izvođeni su tijekom 2019., 2020. i 2021. godine. Potresi koji su se dogodili u Hrvatskoj 2020. godine nisu uzrokovali oštećenja na objektu ili izvedenim radovima. Elaborat procjene oštećenja nakon potresa izvršili su nadzorni inženjer i glavni projektant te šteta nije utvrđena. Vrijednost izvedenih radova iznosi 11.911.861,25 kn što je definirano sukladno dokumentaciji o izvedenim radovima.

Nabave radova nije bilo, već su za izvođenje radova angažirani određeni renomirani izvođači kada se prikupilo dovoljno sredstava za izvođenje dijela radova. Svaki izvođač imao je poseban ugovor i radove je izvodio na temelju izvedbenog projekta. Svaki od izvođača izveo je sve radove definirane ugovorom. Trenutno nema tekućih ugovora s izvođačima.

U nastavku su navedeni već obavljani građevinski radovi:

- Izvedeni su pripremni radovi - čišćenje površina i zidova od postojećeg onečišćenja (prljavštine i prašine), demontaža postojećih krovnih elemenata, ugrađene opreme i stolarije te rušenje, bušenje i adaptacija postojećih konstruktivnih elemenata, postavljanje privremenih ograda i skela u funkciji zaštite na radu te ugradnja kрана kao priprema za sljedeću fazu radova.
- Izvedena je nosiva konstrukcija. Napravljena je od čeličnih stupova i greda. Na trećoj etaži su 4 reda stupova, od kojih su dva postojeća, ugrađena u zidove postojeće strojarnice. Na četvrtom katu izvedena su 3 reda stupova, gdje je u odnosu na treći kat izostavljen jedan red stupova radi bolje organizacije bolesničkih soba i sanitarnih čvorova. Konstrukcija je izvedena u 3 cjeline (dilatacije), s obzirom na oslonce na postojećoj konstrukciji. Stropna konstrukcija izvedena je kao armirano betonska ploča između 3. i 4. etaže.
- Postojeće strojarnice smještene na trećem katu opskrbljuju odjel pedijatrijske hematologije i onkologije na prizemlju i kiruršku jedinicu intenzivne njege na drugom katu. Nije moguće pristupiti strojarnicama iz prostora novog Odjela za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju. Pristup je moguć samo požarnim stepenicama.
- Nosivi zidovi jezgre izvedeni su kao zidani zidovi s armiranobetonskim serklažima. Vanjski zidovi izvedeni su od lakih blokova s armiranobetonskim serklažima. Osim navedenog, zidarski radovi su uključivali i završnu obradu zidova.
- Međuspratna i krovna ploča izvedene su kao FERT sistem debljine 20 cm. Nad prostorom budućeg odjela izgrađen je ravni krov. Prema proračunu izrađen je limeni pokrov koji zadovoljava toplinske uvjete za klimatsku zonu, propisane elemente zvučne zaštite i protupožarne uvjete s obzirom na kategorizaciju građevine.
- Izvedena je hidroizolacija i toplinska izolacija vanjskih zidova i podova u sanitarnim prostorijama.
- Izvedena su betonska podnožja i temelji za strojarску opremu te čelična stubišta. Postavljene su vanjske i unutarnje čelične stepenice.



- Djelomično su izvedeni radovi na pregradnim zidovima i spuštenim stropovima. Također je izvedeno oblaganje podova i zidova.
- Izvedeni su i radovi na fasadi. Fasada je izvedena kao kontinuirana fasada (debljina 15 cm: staklo, zračni ventilacijski sloj, kamena vuna 10 cm, parna brana) koja zadovoljava toplinske uvjete za klimatsku zonu, kao i propisane elemente zvučne zaštite i protupožarne zahtjeve s obzirom na kategorizaciju zgrade.
- Izveden je dio stolarskih radova – vanjska aluminijska stolarija te unutarnja vrata i dovratnici i protupožarna zaštita. Staklene stijene postavljene su kao pregradne ploče unutar perimetra.
- Djelomično je izvedena instalacija sustava vodoopskrbe i sanitarne odvodnje. Sanitarna oprema i uređaji su ugrađeni. Izvedena je i oborinska odvodnja krovništa te postavljena gromobranska instalacija.
- Vertikalni transport je u potpunosti implementiran ugradnjom dizala i pripadajuće strojarske opreme.
- Izveden je dio radova na sustavu protupožarne zaštite, uključujući ugradnju sprinklera i sustava za dojavu požara. Također je izveden dio elektroinstalacija i komunikacijskih instalacija.

## **5 IZVJEŠTAJ O PROVEDBI OKOLIŠNIH I DRUŠTVENIH MJERA ZA DOSAD IZVRŠENE RADOVE**

### **5.1 Metodologija**

Iako je do sada izvedeno dosta građevinskih radova, to još uvijek s financijskog aspekta predstavlja manjinu predviđenih radova. Kao što je već navedeno, sve radove izvodili su ovlaštene izvođači uz prisustvo nadzornih inženjera i koordinatora zaštite na radu.

Svi izvođači radova imali su ugovornu obvezu sav otpad koji nastane tijekom izvođenja radova ukloniti i odvesti s gradilišta na odobrenu lokaciju (odlagalište). Građevinski otpad preuzele su za to ovlaštene tvrtke 3KF d.o.o. i Ce-Za-R d.o.o. te su ga predale na daljnju uporabu u skladište 3KF d.o.o. za otkup metalnog otpada, papira i kartona u Čulinečkoj 218 i reciklažnom centru Cezar Sesvete u Industrijskoj 36, Sesvete. Prilikom svakog odvoza izdan je prateći list otpada. Također, svaki izvođač bio je dužan provoditi sigurnosne mjere kako ljudi i imovina ne bi bili ugroženi prilikom odvoza otpada. Otpad nije bio spaljivan, bacan u jame ili iskope ili korišten za zatrpavanje.

Zbog gore navedenih razloga, provedena je revizija, a sadrži:

- reviziju ugovorne dokumentacije, projektne dokumentacije, troškovnika;
- gradilišnu dokumentaciju (građevinski dnevnik, građevinska knjiga), izvješća nadzornih inženjera, izvješća koordinatora zaštite na radu;
- posjet gradilištu i šetnju gradilištem s predstavnicima korisnika, nadzornim inženjerom i glavnim projektantom;
- vizualni uvid u stanje i uvjete na gradilištu i u neposrednoj blizini istog;
- intervjui i anketu sa dionicima;
- foto-dokumentaciju.


### **5.2 Obilazak lokacije**


Tijekom misija Svjetske banke u ožujku 2022., a zatim u rujnu 2022., tim Svjetske banke, zajedno s članovima jedinice za provedbu projekta, posjetio je gradilište zajedno s predstavnicima korisnika.

U tom trenutku svi gore opisani građevinski radovi bili su završeni. Građevinski otpad uklonjen je odmah po izvođenju radova i propisno zbrinut na privremeno odlagalište gdje se dalje prerađivao za ponovnu uporabu, recikliranje i sl.

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI OKOLIŠNIH I DRUŠTVENIH MJERA ZA DOSAD PROVEDEN RADOVE  
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb  
Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (P173998)**

---

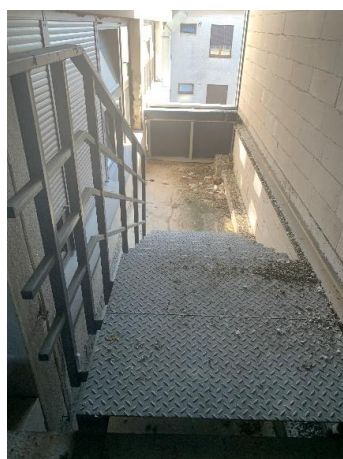

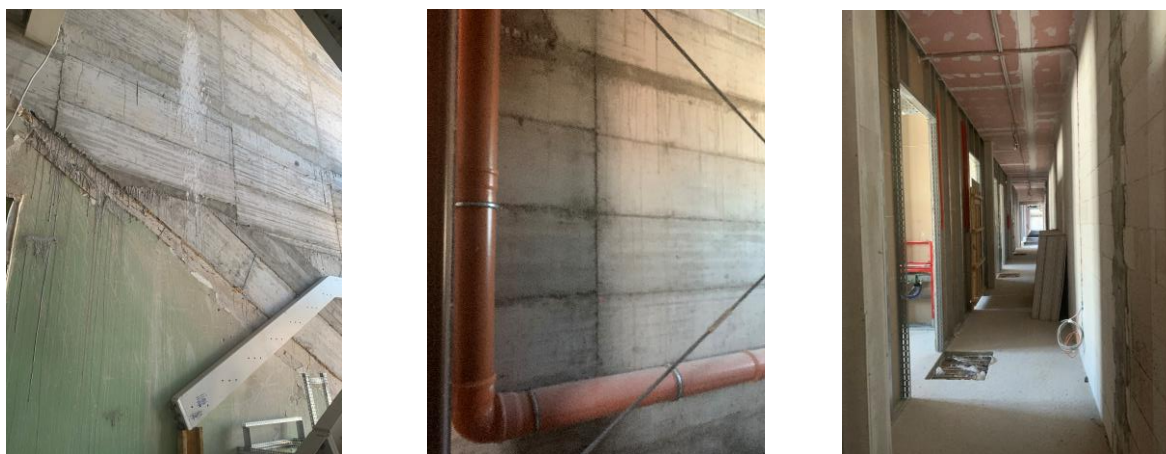

*Slika 6.-17. Fotografije s mjesta pregleda iz ožujka 2022.*

### **5.3 Zapažanja o okolišnim i društvenim pitanjima**

Prema informacijama prikupljenim od koordinatora zaštite na radu i nadzornog inženjera, tijekom izvođenja radova nije bilo značajnijih utjecaja na okoliš.

Može se pretpostaviti da su tijekom navedenih radova utjecaji na okoliš bili tipični za građevinske radove niskog intenziteta i ograničeni na vrijeme izvođenja radova.

S obzirom na to da je koordinator zaštite na radu bio stalno angažiran na izvođenju radova, može se s velikom sigurnošću pretpostaviti da su sve aktivnosti vezane uz gospodarenje otpadom provedene u skladu s nacionalnim zakonima.

Prema informacijama koordinatora zaštite na radu, tijekom pripremnih radova nije bilo izvanrednih situacija niti ozljeda. Izvođači su osigurali osobnu zaštitnu opremu za svoje zaposlenike.

Nadalje, nije bilo prekida u pružanju zdravstvenih usluga na nižim etažama, jer su tijekom građevinskih radova na postojeću zgradu samo dograđene dvije nove etaže (treća i četvrta) te nije bilo interakcije s postojećim uslugama (aneks je samostalna građevina).

### **5.4 Konzultacije s javnošću**

Ovo Izvješće objavljeno je zajedno s Kontrolnom listom Plana upravljanja okolišnim i društvenim rizicima (ESMP Checklist) za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije.

Kontrolna lista Plana upravljanja okolišnim i društvenim rizicima (ESMP Checklist) i Izvješće o provedbi okolišnih i društvenih mjera za dosad provedene radove javno su objavljeni na WEB stranici Projekta<sup>4</sup> tijekom razdoblja od dva tjedna (14.02. – 28.02.2023.). Tijekom tog vremena održano je javno predstavljanje na koje su pozvani svi relevantni dionici, o čemu će biti više riječi u nastavku.

Zbog specifičnog vremenskog okvira ovog potprojekta, gdje su glavni građevinski radovi već obavljeni na temelju već pripremljenih planova, fokus aktivnosti gledano s društvenog aspekta bio je na rekonstrukciji procesa društvene odgovornosti na kojem su i bazirani planovi za ovaj novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije. Cilj aktivnosti bio je identificirati dionike i

---

<sup>4</sup> <https://www.oporavak-i-pripravnost.hr/>



način na koji su oni bili uključeni u proces definiranja potreba za poboljšanjima u pružanju medicinskih usluga te koji aspekti su uzeti u obzir.

Prvi korak u procesu bila je identifikacija dionika i planiranje aktivnosti za prikupljanje informacija o njihovom angažmanu u procesu. Identificirani dionici navedeni su u sljedećoj tablici.

Tablica 5. Identificirani dionici

Glavni dionici	Aktivnosti
Voditelj pedijatrijske hematologije i onkologije	Intervju
Zaposlenici pedijatrijske hematologije i onkologije	Anketa s liječnicima, medicinskim sestrama i drugim osobljem
Osnivači zaklade “Zaklada – dječja onkologija Rebro”	Intervju (pojedinačno ili kao grupa)
Upravitelj zaklade (ujedno i roditelj djeteta pacijenta)	Intervju
Roditelj djeteta pacijenta	Anketni upitnik

Zaključeno je da je angažman ostalih dionika (institucionalni dionici, lokalna zajednica i dr.) već pokriven kroz aktivnosti provedene na drugom potprojektu KBC Zagreb Rebro – faza III, pa će njihov daljnji angažman biti omogućen kroz proces javnih konzultacija (uključujući javnu prezentaciju ovog potprojekta) koja će uključivati javnu objavu ovog dokumenta na mrežnoj stranici Projekta, kao i izravnu diseminaciju informacija svim relevantnim dionicima uz poziv na sudjelovanje u javnim konzultacijama o potprojektu Pedijatrijske hematologije i onkologije davanjem svojih primjedbi i sugestija na objavljeni dokument ili sudjelovanjem u javnom izlaganju.

Tijekom rujna 2022. obavljen je razgovor s voditeljem Pedijatrijske hematologije i onkologije kako bi se dobile informacije o tome kako je proces proveden. Na temelju informacija voditelja Pedijatrijske hematologije i onkologije provedena je anketa sa zaposlenicima i drugim osobama uključenim u utvrđivanje potreba za unapređenjem pružanja medicinskih usluga Pedijatrijske hematologije i onkologije.

Od 16 sudionika ankete najviše ih je bilo s Klinike za dječje bolesti (njih 11), najviše iz Zavoda za hematologiju, onkologiju i transplantaciju koštane srži te Zavoda za hematologiju, onkologiju i transplantaciju krvotvornih matičnih stanica. Ostali sudionici bili su iz OŠ Jordanovac, jer su zaposleni kao učitelji razredne nastave u bolnici (njih 3), jedan sudionik dolazi iz Zaklade za pedijatrijsku onkologiju Rebro, a jedan ispitanik nije dao konkretne podatke o svojoj radnoj poziciji. Svi su sudionici dali input o svojoj uključenosti u proces definiranja potreba za poboljšanjima, kao i informacije o svojim prijedlozima koji su uzeti u obzir pri definiranju planova za novi Odjel za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju. Zaključci ankete i potprojekt Plan uključivanja dionika za potprojekt novog Odjela pedijatrijske hematologije i onkologije nalaze se u prilogu dokumenta.

21. veljače 2023. u 14 sati u Velikoj dvorani Mjesnog odbora Dobri dol na adresi Dobri dol 49 održano je javno predstavljanje projekta novog odjela Pedijatrijske hematologije i onkologije KBC Zagreb Rebro. Na predstavljanje su javnim pozivom bili pozvani zainteresirani građani, poslovni subjekti, vlasnici nekretnina u bližoj okolici te drugi zainteresirani dionici, a skupu je nazočilo ukupno 17 sudionika, među kojima su bili sudionici iz KBC Zagreb Rebro, Medicinskog fakulteta u Zagrebu, KB Merkur, MO Dobri dol, Vijeća Gradske četvrti Maksimir, zaklade Dječja onkologija, autor idejnog rješenja te predstavnici Projekta Oporavka nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva.



Nakon predstavljanja projekta, njegovog idejnog rješenja i trenutnog statusa izgrađenosti te okolišno-društvenog aspekta, odnosno informacije o informiranju i uključivanju dionika, otvorena je diskusija u kojoj je postavljeno 7 pitanja na koja su sudionici odmah pružili odgovore i pojašnjenja, a ostavljena je mogućnost da se pitanja postave i naknadno, odnosno da se do 28.2.2023.g. nastave prikupljati preko adrese elektronske pošte [hematologija@mpgi.hr](mailto:hematologija@mpgi.hr), posebno otvorene za taj projekt. Preciznije informacije o diskutiranim pitanjima nalaze se u prilogu dokumenta. Tijekom javne objave dokumenta na WEB stranicama Projekta pristiglo je jedno pitanje, ali se odnosilo na opće informacije o zajmu Svjetske banke.

#### **5.5 Usklađenost dosad provedenih aktivnosti s Okvirom za okolišna i društvena pitanja (ESF)**

Tablica 6 u nastavku prikazuje usklađenost izvedenih građevinskih radova s ESF, GIIP, EHSK i nacionalnim zakonodavstvom prema dostupnim podacima.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI OKOLIŠNIH I DRUŠTVENIH MJERA ZA DOSAD PROVEDEN RADOVE  
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb  
**Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (P173998)**

Tablica 6. Usklađenost dosad provedenih građevinskih radova s okvirom za okolišna i društvena pitanja (ESF), dobrom međunarodnom industrijskom praksom (GIIP), Smjericama Svjetske banke za zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost (ESHG) i nacionalnim zakonodavstvom

Okolišni i društveni aspekt	Potrebne mjere ublažavanja za već izvedene radove (kao što je navedeno u poglavlju 4.)	Usklađenost s ESF, EHSG i nacionalnom legislativom (DA/NE)	Napomena
<b>Opći uvjeti</b>			
Dozvole i certifikati	1. Sve potrebne dozvole su ishođene i čuvaju se na gradilištu.	DA	Sve zakonom propisane dozvole čuvane su na gradilištu, a korisnik sve izdane dozvole čuva u svojoj arhivi.
	2. Izvođač i podizvođači imaju važeće dozvole za rad.	DA	
	3. Državni inspektorat je obaviješten o nadolazećim aktivnostima, a kopija obavijesti dostupna je na gradilištu.	DA	
	4. Nema neriješenih imovinsko-pravnih pitanja u vezi s lokacijom na kojoj će se nalaziti novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije. Lokacija je u vlasništvu KBC-a Zagreb.	DA	Svi radovi izvedeni su na postojećoj zgradi koja se nalazi na zemljištu u vlasništvu korisnika.
Organizacija gradilišta	5. Plan gradnje dostupan je na gradilištu (u slučaju da dva ili više izvođača izvode građevinske aktivnosti) te su osigurane sve mjere zaštite na radu (svi protokoli i upute za hitne slučajeve moraju biti dostupni na gradilištu, npr. u slučaju potresa, požara itd.).	DA	Izvođači radova nisu ometali jedni druge, a osigurane su sve mjere zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.
	6. Određena je osoba zadužena za komunikaciju i zaprimanje zahtjeva/ žalbi lokalnog stanovništva.	Djelomično	Nije bilo službene odluke o osobi zaduženoj za komunikaciju i zaprimanje žalbi, ali su se sve pritužbe mogle podnijeti izravno korisniku. Nije bilo zabilježenih pritužbi.
	7. Plan pripravnosti i odgovora na hitne slučajeve (eng. <i>Emergency preparedness and response plan</i> (EPR)) je izrađen za izvođenje radova. Navedenim Planom će se definirati radnje koje se moraju poduzeti kako bi se osigurala sigurnost radnika od požara i drugih hitnih slučajeva. Plan zaštite od požara mora uključivati, ali nije ograničen na, popis glavnih opasnosti od požara na radnom mjestu, postupke pravilnog rukovanja i skladištenja zapaljive opreme i materijala, potencijalne izvore požara i postupke kontrole te opis zaštite od požara, dokumentaciju o obuci,	NE	Plan pripravnosti i odgovora na hitne slučajeve (eng. <i>Emergency preparedness and response plan</i> (EPR)) za izvođenje radova nije izrađen. EPR nije bila ni obveza izvođača ni zakonska obveza. Izradit će se EPR za nastavak radova i fazu uporabe zgrade.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI OKOLIŠNIH I DRUŠTVENIH MJERA ZA DOSAD PROVEDEN RADOVE  
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb  
**Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (P173998)**

	opremu i sustave. Plan također uključuje, ali nije ograničen na popis cjelokupne opreme za hitne slučajeve na gradilištu (kao što su sustavi za gašenje požara, oprema za kontrolu izlivanja, komunikacije i alarmni sustavi (unutarnji i vanjski) i oprema za dekontaminaciju (ako je oprema potrebna), kontakte odgovornih osoba, nadležnih tijela, drugi brojevi za hitne slučajeve te plan evakuacije. Ovaj Plan mora se po potrebi ažurirati. Osim toga, Plan mora sadržavati lokaciju i fizički opis svake stavke na popisu te kratak nacrt njegovih mogućnosti.		
	8. U slučaju značajne nesreće/incidenta (smrt, ozbiljna ozljeda, veće izlivanje, požar i slično) potrebno je obavijestiti kontaktnu točku MPGI i JPP (koje će zatim obavijestiti Svjetsku banku) u roku od 12 sati. Aktivnosti će se odvijati u skladu s Procedurom projekta u slučaju incidenta/nesreća.	Nije primjenjivo	Nije bilo prijavljenih nesreća/incidenata.
	9. Sve aktivnosti vezane za sigurnost i zaštitu na radu moraju biti dokumentirane, uključujući sve bolesti/ozljede, itd.	Nije primjenjivo	Nije bilo prijavljenih ozljeda.
<b>Zaštita na radu te zdravlje i sigurnost zajednice (lokalnog stanovništva)</b>			
Dobrovoljni rad	10. Svi radnici moraju raditi na dobrovoljnoj bazi. Nije dozvoljeno zapošljavanje pod prisilom.	Nije primjenjivo	Svi radnici su primili odgovarajuću naknadu.
Sigurnost radnika	11. Obavezno je korištenje zaštitne opreme, osobne zaštitne opreme radnika i provođenje sigurnosnih procedura u skladu sa zakonodavstvom i dobrom međunarodnom praksom (npr. nošenje zaštitnih kaciga, maski i zaštitnih naočala, pojasa i zaštitnih čizama, odgovarajućih maski ili respiratora pri radu s azbestom itd. ).	DA	Prema informacijama prikupljenim od koordinatora zaštite na radu.
	12. Radnici su dužni koristiti osobnu opremu za zaštitu od buke u slučajevima definiranim člankom 8. Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08).	DA	Prema informacijama prikupljenim od koordinatora zaštite na radu..
	13. Odgovarajući informativni i upozoravajući znakovi na gradilištima informiraju radnike o ključnim pravilima i propisima kojih se moraju pridržavati.	DA	
	14. Strojevima rukuje samo iskusno i odgovarajuće obučeno osoblje, čime se smanjuje rizik od nezgoda.	DA	
	15. Uređaji, oprema i aparati za gašenje požara su atestirani i ispravni, tako da se u slučaju potrebe mogu brzo i učinkovito koristiti. Pribor prve pomoći mora biti dostupan na gradilištu, a radnici moraju biti osposobljeni za njegovo korištenje.	Informacije nisu dostupne	

IZVJEŠĆE O PROVEDBI OKOLIŠNIH I DRUŠTVENIH MJERA ZA DOSAD PROVEDEN RADOVE  
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb  
**Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (P173998)**

	16. Radnici su odgovarajuće obučeni za radna mjesta i poslove koje obavljaju, radnici posjeduju važeće radničke certifikate npr. certifikate za električnu sigurnost (za ovlaštenog električara), rad s azbestnim materijalima itd.	DA	
	17. Procedure za hitne slučajeve (uključujući izlivanja, nesreće itd.) dostupne su na gradilištu.	Informacije nisu dostupne	
	18. Na gradilištu su osigurani odgovarajući sanitarni čvorovi (toaleti i prostori za pranje) s odgovarajućom opskrbom tople i hladne tekuće vode i sapuna.	DA	
	19. Kupljena oprema je instalirana i koristi se u skladu sa svim sigurnosnim mjerama propisanim od strane proizvođača opreme i u skladu s najboljom praksom.	DA	Prema informacijama nadzornog inženjera.
Zdravlje radnika s obzirom na postupanje s azbestom	20. Utvrdite postoji li mogućnost prisutnosti materijala koji sadrže azbest: a. Investitor je dužan osigurati da je izvođač radova prije početka građevinskih radova upoznat s materijalima i tvarima koji se nalaze u odgovarajućoj građevini, a koji predstavljaju azbestni otpad ili za koje je sigurno da će nakon radova rekonstrukcije postati azbestni otpad.	Nije primjenjivo	Nije zabilježena prisutnost azbesta.
	21. Pri rukovanju azbestnim otpadom potrebno je pridržavati se propisanih uvjeta zaštite na radu. Radnici moraju imati odgovarajuću zaštitnu opremu, zaštitne maske i moraju proći odgovarajuću obuku za rukovanje azbestnim otpadom.	Nije primjenjivo	Nije zabilježena prisutnost azbesta.
	22. U slučaju opasnog azbestnog otpada potrebno je ishoditi dokumentaciju o predaji na krajnje odredište.	Nije primjenjivo	Nije zabilježena prisutnost azbesta.
Diskriminacija prema ženama i osjetljivim skupinama tijekom procesa zapošljavanja	23. Plaće i uvjeti ugovora koji se nude svim zaposlenicima trebaju biti u skladu s hrvatskim zakonima o radu ili višim standardima koji trebaju biti konkurentni u svim kategorijama radnika.	DA	Koordinator zaštite na radu provjerava ima li radnik sklopljen ugovor o radu. Budući da nije bilo evidentiranih nesukladnosti od strane koordinатора, pretpostavljamo da su svi radnici imali ugovor o radu. Ako radnik ima ugovor o radu, u tom slučaju mora imati minimalnu plaću koja je određena Zakonom o minimalnoj plaći i uredbom za svaku kalendarsku godinu koju donosi Vlada Republike Hrvatske.



IZVJEŠĆE O PROVEDBI OKOLIŠNIH I DRUŠTVENIH MJERA ZA DOSAD PROVEDEN RADOVE  
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb  
**Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (P173998)**

	24. Žalbeni mehanizam (eng. <i>Grievance Redress Mechanism (GRM)</i> ) za radnike izvođača i podizvođača je uspostavljen i provodi se.	Informacije nisu dostupne	
Upravljanje radom	25. Informacije o Pravilima ponašanja za radnike moraju se dostaviti na lokalnom jeziku (jezicima).	Nije primjenjivo	Radnici su bili zaposlenici tvrtki koje su obavljale radove.
	26. Adekvatne plaće moraju biti uplaćene na bankovne račune radnika, a ne isplaćene u gotovini.	DA	
	27. Radnici se moraju zapošljavati putem ureda za zapošljavanje kako bi se izbjeglo zapošljavanje „na crno“ i time obeshrabrio spontani priljev tražitelja posla.	DA	
Moguće zaraze virusom COVID-19	28. Potrebno je osigurati prikladno postupanje za sve potrebne zahtjeve za dobrobit i higijenu te za prevenciju epidemije COVID-19 (redovita isporuka osobne zaštitne opreme, osigurati da se protokoli za redovitu dezinfekciju prostorija, opreme, alata nalaze na gradilištu te da se postupa sukladno njima, osigurati da su uvijek prostorije za pranje ruku i druge sanitarije opskrbljene čistom vodom, sapunom, dezinficijensom itd.).	DA	Prema informacijama prikupljenim od koordinatora zaštite na radu.
	29. Osigurati provođenje obuke radnika o higijeni i drugim preventivnim mjerama protiv COVID-19.	DA	Prema informacijama prikupljenim od koordinatora zaštite na radu.
	30. Sukladno epidemiološkoj situaciji u zemlji, potrebno je pridržavati se preporuka Svjetske zdravstvene organizacije (WHO; <a href="https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public">https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public</a> ) i preporuka na službenim stranicama Vlade za točne i provjerene informacije o COVID-19 ( <a href="https://koronavirus.hr/en">https://koronavirus.hr/en</a> ).	DA	
Spolno iskorištavanje i zlostavljanje (eng. <i>Sexual Sexual Exploitation and Abuse (SEA)</i> )  Spolno uznemiravanje (eng. <i>Sexual Harrasment (SH)</i> )	31. Radnici ne smiju sudjelovati u spolnom uznemiravanju, što uključuje neželjeno spolno približavanje, zahtjeve za spolnim uslugama i druge vrste verbalnog ili tjelesnog ponašanja spolne prirode u odnosu na drugo izvođačevo osoblje.	DA	Nije bilo prijavljenog spolnog uznemiravanja.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI OKOLIŠNIH I DRUŠTVENIH MJERA ZA DOSAD PROVEDEN RADOVE  
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb  
**Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (P173998)**

	32. Radnici ne smiju sudjelovati u spolnom iskorištavanju, što uključuje zloupotrebu ili pokušaj zloupotrebe položaja ranjivosti, odnosno razlike u razini moći ili povjerenja u spolne svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na ostvarivanje materijalne, društvene ili političke koristi od spolnog iskorištavanja druge osobe.	DA	Nije bilo prijavljenog spolnog iskorištavanja.
	33. Radnici ne smiju sudjelovati u spolnom zlostavljanju, što uključuje fizički napad ili pokušaj napada spolne prirode, bilo silom ili pod neravnopravnim ili uvjetima prisile.	DA	Nije bilo prijavljenog spolnog zlostavljanja.
	34. Radnici ne smiju sudjelovati u bilo kakvom obliku spolne aktivnosti s osobama mlađima od 18 godina, osim u slučaju već postojećeg braka.	DA	Nije bilo prijavljenih spolnih aktivnosti s osobama mlađim od 18 godina.
Sigurnost zajednice/ lokalnog stanovništva	35. Gradilište je propisno ograđeno i označeno. Postavljeni su znakovi zabrane pristupa gradilištu svima osim radnicima na gradilištu.	DA	Prema informacijama prikupljenim od koordinatora zaštite na radu i nadzornog inženjera.
	36. Zabranjen je ulaz nezaposlenim osobama na gradilište (unutar traka upozorenja i ograda kada i gdje se procijeni da je potrebno).	DA	
	37. Okolno područje u blizini projekta održava se čistim. Nema privremenog skladištenja građevinskog materijala i otpada unutar bilo koje vrste privatnog vlasništva.	DA	
	38. Otvorene jame i druga opasna mjesta su pokrivena i jasno označena kada se na njima ne radi.	Nije primjenjivo	Svi radovi izvedeni su nadzemno.
<b>Kvaliteta zraka</b>			
Smanjena kvaliteta zraka u okolnom području uslijed emisije prašine i čestica	39. Špricati vodom građevinske rasute materijale i neasfaltirane ceste. Koristiti vodu kako bi se smanjila prašina pri čišćenju zemljišta, krčenju, struganju, iskapanju, ravnanju zemljišta, izgradnji usjeka i nasipa te aktivnostima rušenja koje mogu uzrokovati prašenje i emisije čestica.	DA	Nije bilo zemljanih radova. Radovi na rušenju bili su ograničeni i izvedeni su bez zaprašivanja.
	40. Teret (površine) moraju biti pokriveni tijekom transporta materijala kako bi se izbjeglo širenje prašine.	DA	
	41. Potrebno je uspostaviti odgovarajuće lokacije za skladištenje, miješanje i utovar građevinskog materijala unutar gradilišta.	DA	
	42. Ograničiti brzinu kretanja vozila na 20 km/h na gradilištu i na 10 km/s na pristupnim cestama u blizini stambenih kuća.	DA	

IZVJEŠĆE O PROVEDBI OKOLIŠNIH I DRUŠTVENIH MJERA ZA DOSAD PROVEDEN RADOVE  
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb  
**Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (P173998)**

	43. Gradilište i pristupne ceste redovito se moraju čistiti od otpada, rasutog materijala i dr.	DA	
	44. Kamioni koji prevoze iskopanu zemlju i druge građevinske materijale do i od gradilišta trebaju prekriti taj materijal kako bi se smanjila fugitivna emisija prašine.	Nije primjenjivo	Nije bilo zemljanih radova niti su u radovima korištene sirovine.
	45. Sprječiti širenje prašine izvan lokacije gradilišta pomoću odgovarajućih zaštitnih ograda, posebno u blizini stambenih kuća uz pristupnu cestu.	DA	
	46. Izbjegavati nepotrebna putovanja.	DA	
Smanjena kvaliteta zraka uslijed emisije plinova	47. Koristiti legalne izvore goriva.	Informacije nisu dostupne	Na gradilištu je bio vrlo mali broj strojeva i opreme.
	48. Strojevi i oprema su isključeni kada se ne koriste (nalaze se u načinu mirovanja).	DA	
	49. Redovito održavati, servisirati i podešavati motore i servisirati građevinsku opremu.	Informacije nisu dostupne	
	50. Spaljivanje otpada na lokaciji (ili drugdje) strogo je zabranjeno.	DA	Otpad nije bio spaljivan.
<b>Buka</b>			
Povećana razina buke u okolnom području	51. Najveća dopuštena razina buke za gradilište je 65 dB. Dopušteno je prekoračenje te razine za dodatnih 5 dB u razdoblju od 8 do 18 sati. Poželjno je da se radovi izvode u vremenu od 8 do 18 sati i da se radovi ne izvode noću.	Informacije nisu dostupne	Mjerenje buke na gradilištu nije provedeno.
	52. Unaprijed i pravovremeno obavijestiti lokalno stanovništvo i zajednicu o svim radnim aktivnostima izvan uobičajenog radnog vremena ili vikendom.	Nije primjenjivo	Radovi nisu izvođeni izvan uobičajenog radnog vremena.
	53. Sva oprema mora se održavati u dobrom radnom stanju i biti atestirana.	DA	Prema informacijama prikupljenim od koordinatora zaštite na radu.
	54. Tijekom rada poklopci motora generatora, zračnih kompresora i druge pogonske mehaničke opreme moraju biti zatvoreni, a oprema smještena što je dalje moguće od stambenih zgrada.	DA	Prema informacijama prikupljenim od koordinatora zaštite na radu.
<b>Kvaliteta površinskih i podzemnih voda / Kvaliteta tla</b>			
Onečišćenje površinskih voda, podzemnih voda i tla	55. Rukovanje motornim uljem mora se obavljati na nepropusnim površinama na siguran i odgovoran način.	DA	

IZVJEŠĆE O PROVEDBI OKOLIŠNIH I DRUŠTVENIH MJERA ZA DOSAD PROVEDEN RADOVE  
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb  
**Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (P173998)**

uslijed izlivanja onečišćujućih tvari			
	56. Svim materijalima mora se rukovati i upravljati u skladu s uputama uključenim u sigurnosno-tehničke listove i tehničke listove koji moraju biti dostupni na gradilištu.	Informacije nisu dostupne	
	57. U slučaju nesreće, ukloniti sve opasne tekućine iz tla pomoću adsorpcijskih materijala kao što su pijesak, piljevina ili mineralni adsorbenti. Takav otpad potrebno je skupiti u posebne spremnike, skladištiti u prostor predviđen za skladištenje opasnog otpada i predati ovlaštenim tvrtkama za opasni otpad.	Nije primjenjivo	Nije bilo prijavljenih nesreća.
	58. Spriječiti opasno izlivanje iz spremnika (obavezni sekundarni sustav zadržavanja, npr. spremnici s tankvanama, spremnici s dvostrukim stijenkama), građevinske opreme i vozila (redovito održavanje i pregledi spremnika za naftu i plin, nastojte samo parkirati (manipulirati)) strojevima i vozilima na asfaltiranim ili betonskim površinama s površinskim sustavom za prikupljanje otjecanja vode).	DA	Točenje goriva je obavljeno na benzinskoj pumpi.
	59. Organizirati i pokriti površine za skladištenje materijala.	DA	Prema informacijama prikupljenim od koordinatora zaštite na radu.
	60. Izolirati područja ispiranja betona i druge opreme od vodotoka odabirom područja za ispiranje koja nemaju slobodnu drenažu izravno ili neizravno u vodotok.	Nije primjenjivo	U blizini gradilišta nema vodotokova.
	61. Zabranjeno je crpiti podzemnu vodu na nereguliran način, kao i ispuštanje cementne kaše ili bilo koje druge onečišćene vode u tlo ili okolne vodotoke na nekontrolirani način.	Nije primjenjivo	
	62. Osigurati postavljanje odgovarajućih sustava za odvodnju oborinskih voda i poduzeti mjere opreza i sprječavanja zamuljivanja, onečišćenja, pregrađivanja ili drugog negativnog utjecaja na okolne prirodne potoke, rijeke, bare i jezera aktivnostima obnove.	Nije primjenjivo	
	63. Redovito održavati i servisirati građevinske strojeve.	Informacije nisu dostupne	
	64. Pridržavati se mjera i normi za građevinske strojeve.	Informacije nisu dostupne	
	65. Izbjegavati skladištenje goriva i drugih opasnih tekućina i materijala na gradilištu. Ako će biti potrebna ugradnja spremnika za skladištenje	Nije primjenjivo	



IZVJEŠĆE O PROVEDBI OKOLIŠNIH I DRUŠTVENIH MJERA ZA DOSAD PROVEDEN RADOVE  
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb  
**Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (P173998)**

	goriva, oni moraju imati sekundarne spremnike dovoljnog volumena da zadrže izlivanje iz najvećeg spremnika goriva u strukturi. Prostor za zadržavanje mora imati uređaj (pumpu) za uklanjanje nakupljene vode.		
	66. Spremnike opasnih tvari čuvati u nepropusnom spremniku kako bi se spriječilo izlivanje i curenje. Spremnik mora imati sekundarni sustav zadržavanja kao što su npr. spremnici s okovom, dvostruke stijenke ili slično. Sekundarni sustav zadržavanja mora biti bez pukotina, mora zadržati izlivanje i mora se brzo isprazniti.	Nije primjenjivo	Nije bilo potrebe za spremnicima opasnih tvari.
	67. Spremnici opasnih tvari moraju biti zatvoreni, osim prilikom dodavanja ili uklanjanja materijala/otpada. Ne smije se njima rukovati, otvarati ih ili skladištiti na način koji bi mogao uzrokovati curenje.	Nije primjenjivo	Nije bilo potrebe za spremnicima.
<b>Bioreaznolikost (flora i fauna)</b>			
	68. Ograničiti kretanje teške mehanizacije na koridor pristupne ceste.	DA	
	69. Radove uz vodotoke te na vodotocima i kanalima ograničiti na što manje površine.	Nije primjenjivo	Svi radovi su se odvijali na gradilištu.
	70. Izbjegavati, kad i gdje je to moguće, sječu drveća i druge prirodne vegetacije. U slučaju uklanjanja vegetacije, jasno označiti područja s kojih će se vegetacija ukloniti kako bi se spriječio nepotreban gubitak vegetacije na području zahvata.	DA	Nije bilo uklanjanja vegetacije.
	71. Za krajobrazno uređenje okolnog prostora i ozelenjavanje koristiti samo autohtone biljne vrste koje se javljaju u vegetacijskim zajednicama prisutnim na širem području podprojekta.	Nije primjenjivo	Nisu izvođeni radovi na uređenju okoliša.
<b>Ometanje odvijanja prometa</b>			
Povećanje cestovnog prometa	72. Upravljanje prometom provodi se u skladu s odredbama zakonodavstva iz sektora cestovnog prometa i ESF-a (npr. odgovarajuća rasvjeta, prometni sigurnosni znakovi, barijere i osobe sa zastavama koje su lako vidljive ili ih je lako pratiti, brzina na cesti mora biti jasno označena).	DA	
<b>Stvaranje otpada i gospodarenje otpadom</b>			
Gospodarenje otpadom	73. Svaka vrsta nastalog otpada na lokaciji mora se privremeno skladištiti u posebne spremnike za otpad koji moraju biti označeni nazivom vrste otpada i šifrom otpada i smješteni na za to predviđenu čvrstu podlogu na gradilištu.	DA	Nastali otpad uklonjen je s gradilišta i odvezen na privremeno odlagalište.
	74. Građevinski otpad mora se odlagati isključivo na za to predviđenim mjestima.	DA	

IZVJEŠĆE O PROVEDBI OKOLIŠNIH I DRUŠTVENIH MJERA ZA DOSAD PROVEDEN RADOVE  
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb  
**Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (P173998)**

	75. Za svaku vrstu otpada koja nastaje na lokaciji potrebno je voditi evidenciju o tokovima i količinama otpada.	DA	Građevinski otpad preuzele su ovlaštene tvrtke. Prilikom svakog odvoza izdan je Prateći list za otpad.
	76. Vođenje evidencije o nastalom otpadu obveza je izvođača radova, osim ako ugovorom nije drugačije određeno.	DA	Građevinski otpad preuzele su ovlaštene tvrtke. Prilikom svakog odvoza izdan je Prateći list za otpad.
	77. Sav otpad potrebno je s odgovarajućom dokumentacijom predati ovlaštenim tvrtkama za gospodarenje otpadom (društvima koja imaju odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom).	DA	Građevinski otpad preuzele su ovlaštene tvrtke. Prilikom svakog odvoza izdan je Prateći list za otpad.
	78. U slučaju opasnog otpada, potrebno je pribaviti podatke o predaji otpada na krajnje odredište.	Nije primjenjivo	Nije bilo opasnog otpada.
	79. Kad god je to moguće, izvođač će ponovno upotrijebiti i reciklirati odgovarajuće i održive materijale (osim azbesta).	Informacije nisu dostupne	
	80. Mineralni (prirodni) građevni otpad i otpad od rušenja mora se razvrstavanjem na licu mjesta odvojiti od komunalnog otpada, organskog, tekućeg i kemijskog otpada te privremeno skladištiti u odgovarajuće spremnike. Ovisno o podrijetlu i sadržaju, mineralni otpad mora se ponovno vratiti na izvornu lokaciju ili ponovno upotrijebiti.	DA	Građevinski otpad razvrstan je i odložen na privremeno odlagalište.
	81. Prijevoz opasnih tvari i otpada vršiti u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07, 70/17) i drugim relevantnim nacionalnim zakonodavstvom te standardima Svjetske banke (ESS4).	Nije primjenjivo	Nije bilo opasnog otpada.
	82. Spaljivanje ili ilegalno odlaganje otpada strogo je zabranjeno.	DA	Otpad se nije spaljivao niti ilegalno odlagao.
<b>Kulturna baština</b>			
Potencijalni slučajni nalazi	83. Ako se tijekom iskapanja naiđe na arheološke nalaze, radove je potrebno odmah prekinuti i obavijestiti nadležne organe. Radovi će se nastaviti tek nakon što su poduzete odgovarajuće mjere prema zahtjevu nadležnog tijela i nakon što ono potvrdi da se radovi mogu nastaviti za sve slučajeve kada se kulturna baština i njezine temeljne vrijednosti mogu zaštititi na postojećoj lokaciji posebnim mjerama zaštite.	DA	Nije bilo zemljanih radova. Nisu nađeni arheološki ostaci.
<b>Uključivanje dionika</b>			
Uključivanje lokalne zajednice	84. Lokalno stanovništvo unaprijed i pravovremeno je obaviješteno o svim građevinskim aktivnostima izvan uobičajenog radnog vremena ili vikendom	Nije primjenjivo	Nije bilo radnih aktivnosti izvan uobičajenog radnog vremena.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI OKOLIŠNIH I DRUŠTVENIH MJERA ZA DOSAD PROVEDEN RADOVE  
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb  
**Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (P173998)**

Društveni sukobi koji proizlaze iz prisutnosti građevinskih radnika i izvođenja građevinskih radova	85. Pravila ponašanja za radnike treba pripremiti, distribuirati, potpisati i provoditi.	Informacije nisu dostupne	
	86. Uključivanje dionika provesti će se prije početka radova.	DA	Dionici su bili uključeni u proces definiranja potreba za unapređenjem pružanja zdravstvenih usluga.
	87. Okolni stanovnici će se periodično intervjuirati kako bi se utvrdilo postoje li nedoumice koje proizlaze iz projektnih aktivnosti.	Informacije nisu dostupne	
	88. Žalbeni mehanizam će biti pripremljen i implementiran.	Informacije nisu dostupne	Nije bio uspostavljen službeni žalbeni mehanizam, ali su se prigovori mogli uputiti direktno korisniku. Nije zaprimljena ni jedna primjedba.

## **5.6 Zaključak**

Do sada izvedeni radovi na izgradnji novog Odjela za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju nisu predmet retroaktivnog financiranja kroz Projekt Zajma 9127HR.

Evidencija i informacije o načinu provedbe mjera zaštite okoliša te mjere vezane za društvena pitanja su uglavnom dostupne te se donose sljedeći zaključci:

- Gospodarenje otpadom odvijalo se u skladu s hrvatskim zakonima i zakonodavnim okvirom.
- Građevinski otpad je odvezen na privremeno odlagalište te razvrstan i deponiran, gdje je dalje prerađen za ponovnu upotrebu.
- Tijekom izvođenja radova nisu zabilježene nesreće i ozljede. Izvođači su u najvećoj mogućoj mjeri osigurali zaštitnu opremu za svoje radnike.
- Svi radnici su bili novčano nadoknađeni za svoj rad, nije bilo prisilnog rada.
- Zemljište na kojem se nalazi objekt u vlasništvu je korisnika. Nema neriješenih imovinsko-pravnih pitanja.
- Iako formalni žalbeni mehanizam nije uspostavljen tijekom izvođenja radova, pritužbe su se mogle podnijeti izravno korisniku. Nije zabilježena nijedna pritužba.
- Dionici su bili uključeni u proces definiranja potreba za poboljšanjima u pružanju medicinskih usluga.



## 6 PRILOZI

### 6.1 PRILOG 1 – Plan uključivanja dionika potprojekta

Vrsta dionika	Dionici		Tema(e) uključivanja	Faza I (PRIJE IZGRADNJE)		Faza II (TIJEKOM IZGRADNJE)		Faza III (POSLIJE IZGRADNJE)		ODGOVORNOST ZA PROVEDBU
				Korištene metode / Planirane aktivnosti / Indikatori	Razdoblje provedbe	Korištene metode / Planirane aktivnosti / Indikatori	Razdoblje provedbe	Korištene metode / Planirane aktivnosti / Indikatori		
POGOĐENI DIONICI	ZAPOSLENICI (MEDICINSKO I NEMEDICINSKO OSOBLJE)	Ravnatelj bolnice, liječnici	Utjecaj na radne procese (mogući prijedlozi poboljšanja) Pitanja vezana uz promet (osobne potrebe i problemi s prijevozom pacijenata) Problemi zaštite okoliša vezani uz građevinske radove (buka, prašina...) i mogućnost privremene organizacije radnih procesa tijekom građevinskih radova	Metode informiranja i angažiranja: • strukturirani intervjui ili anketa • informacije objavljene na web stranici Projekta • informacije o dostupnom žalbenom mehanizmu i namjenskoj e-pošti: hematologija@mpgi.hr Indikatori: intervjui provedeni s najmanje jednim ili dva liječnika	listopad - studeni 2022	Metode informiranja i angažiranja dionika: • prezentacija ključnih informacija iz glavnog/izvedbenog projekta dionicima – predstavnicima bolničkog osoblja (ravnatelj, liječnici, medicinske sestre, tehničari, pomoćno tehničko osoblje i drugo osoblje) • javna obavijest o početku izvođenja radova • informacije objavljene na web stranici Projekta Indikatori: očekivani neizravni domet (preko predstavnika ili uspostavljenih službenih kanala u bolnici) što većeg broja zaposlenika	Nakon izrade glavnog/izvedbenog projekta	Metoda informiranja dionika: • javno događanje povodom otvorenja novih zgrada s pozivom medijima (nije u organizaciji Projekta), uključujući bolničko osoblje (ravnatelj, liječnici, medicinske sestre, tehničari i primalje, pomoćno tehničko osoblje i drugo osoblje) • informacije objavljene na web stranici Projekta Metoda angažiranja dionika: Upitnik s testiranjem zadovoljstva korisnika	Pri kraju radova i završetka izgradnje	Tim za društvena pitanja JPP-a
		Medicinske sestre, tehničari		Metoda informiranja dionika: • širenje informacija putem službenih bolničkih kanala (koje koristi uprava) • dodatna komunikacija na oglasnim pločama unutar bolnica (ako drugi načini komunikacije ne bi bili						
		Osoblje tehničke podrške								

IZVJEŠĆE O PROVEDBI OKOLIŠNIH I DRUŠTVENIH MJERA ZA DOSAD PROVEDEN RADOVE  
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb  
**Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (P173998)**

		Ostalo osoblje, uključujući učitelje koji pacijentima drže školsku nastavu		učinkoviti) Metoda angažiranja dionika: • anketni upitnici (kako bi se uključio što veći broj djelatnika) • informacije objavljene na web stranici Projekta • informacije o dostupnom žalbenom mehanizmu i namjenskoj e-pošti: hematologija@mpgi.hr Indikatori: Zajednička anketa ili fokus grupa s 5-6 zaposlenika				Indikatori: dobivene povratne informacije od najmanje 10 zaposlenika		
	ZAKLADA "Zaklada - dječja onkologija Rebro"	Osnivači zaklade								
	PACIJENTI	Roditelji hospitalizirane djece pacijenata	Specifičnosti smještaja u bolnici tijekom posjeta ili boravka s djetetom; tehnički aspekt pružene medicinske usluge	Metoda informiranja dionika: • širenje informacija putem medicinskog osoblja pedijatrijske hematologije Metoda angažiranja dionika: • intervjui ili anketni upitnici • informacije objavljene na web stranici Projekta • informacije o dostupnom žalbenom mehanizmu i namjenskoj e-pošti: hematologija@mpgi.hr Indikatori: dobivene povratne informacije od roditelja najmanje 3 pacijenta	studeni 2022	Metoda informiranja dionika: obavijest na oglasnoj ploči unutar bolnice o ključnim informacijama iz glavnog/izvedbenog projekta (sažetak i/ili dokument dostupan na web stranici Projekta) javna obavijest o početku izvođenja radova Indikatori: podijeljene informacije na nekoliko pozicija u bolnici	Nakon izrade glavnog/izvedbenog projekta	Metoda informiranja dionika: • obavijest o završenom projektu na oglasnim pločama unutar bolnice (sažetak dostupan na web stranici Projekta) • informacije objavljene na web stranici Projekta Metoda angažiranja dionika: • upitnik s testiranjem zadovoljstva korisnika Indikatori: dobivene povratne informacije od roditelja pacijenata ili pacijenata iz udruge	Pri kraju radova i završetka izgradnje	

IZVJEŠĆE O PROVEDBI OKOLIŠNIH I DRUŠTVENIH MJERA ZA DOSAD PROVEDEN RADOVE  
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb  
**Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (P173998)**

	LOKALNA ZAJEDNICA	Stanovnici mjesnog odbora Dobri dol, njihov mjesni odbor	Problemi vezani uz trenutnu regulaciju prometa na Rebru. Njihovi prijedlozi za poboljšanje prometne situacije. Prisutna bolnička buka Problemi zaštite okoliša (buka, prašina ...) tijekom građevinskih radova.	Metoda informiranja dionika: •informacije objavljene na web stranici Projekta • javne konzultacije • obavijesti na oglasnoj ploči u mjesnom odboru Dobri dol (uključujući i pano na ulazu u bolnicu) Metoda angažiranja dionika: • konzultacije s Vijećem mjesnog odbora Dobri dol • javne prezentacije za stanovnike MO Dobri dol • informacije o dostupnom žalbenom mehanizmu i namjenskoj e-pošti: hematologija@mpgi.hr Indikatori: dobivena povratna informacija/posjet prezentaciji od najmanje 5-6 stanovnika MO Dobri dol ili njihovih predstavnika iz Vijeća mjesnog odbora	Veljača 2023 (javne konzultacije)  Napomena: budući da se radi o istim dionicima kao i na drugom podprojektu KBC-a Zagreb Rebro, njihovi inputi će se uzeti u obzir na temelju intervjua obavljenih s njima za potrebe drugog podprojekata u KBC-u Zagreb Rebro, ali i kroz javne konzultacije čije je održavanje planirano za 21. veljače 2023.,	Metoda informiranja i angažiranja dionika: • dostavljanje ključnih informacija iz glavnog/izvedbenog projekta putem e-maila sudionicima iz prethodne faze konzultacija • obavijest na oglasnoj ploči mjesnog odbora • u slučaju zahtjeva zainteresiranih građana organizirati javno izlaganje u mjesnom odboru; javna obavijest o početku izvođenja radova. Indikatori: informirano lokalno stanovništvo (izravno ili preko svog mjesnog odbora)	Nakon izrade glavnog/izvedbenog projekta	Metoda informiranja dionika: • Obavijest o završetku projekta upućena sudionicima u prethodnim fazama savjetovanja • Informacije o završenom projektu koje su prenijeli mediji • Informacije na web stranici Projekta Indikatori: informacije podijeljene na 10-12 adresa e-pošte	Pri kraju radova i završetka izgradnje	
	OBRAZOVNE USTANOVE	Osnovna kola Jordanovac (ravnatelj, pedagog, učitelji/professori, vijeće roditelja)	Problemi sigurnosti djece u prometu i ekološki problemi (buka, prašina...) tijekom građevinskih radova	Metoda informiranja i angažiranja dionika: •informacije objavljene na web stranici Projekta • konzultacije s ravnateljem škole ili s pedagogom, učiteljima/profesorima i vijećem roditelja OŠ Jordanovac • informacije o dostupnom žalbenom mehanizmu i namjenskoj e-pošti: hematologija@mpgi.hr Indikatori: Realizirani konzultacijski sastanci	specifično za podprojekt Pedijatrijske hematologije i onkologije	Metoda informiranja i angažiranja dionika: organiziranje prezentacije ključnih informacija iz glavnog/izvedbenog projekta djelatnicima škole i vijeću roditelja u suradnji s ravnateljem škole; javna obavijest o početku izvođenja radova. Indikatori: očekivani doseg svih roditelja i učenika škole	Nakon izrade glavnog/izvedbenog projekta			

IZVJEŠĆE O PROVEDBI OKOLIŠNIH I DRUŠTVENIH MJERA ZA DOSAD PROVEDEN RADOVE  
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb  
**Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (P173998)**

		Podružnica dječjeg vrtića Bukovac (ravnatelj, pedagog i odgajatelji)		Metoda informiranja i angažiranja dionika: •informacije objavljene na web stranici Projekta • konzultacije s ravnateljicom vrtića, pedagogom, odgajateljima i vijećem roditelja vrtića • informacije o dostupnom žalbenom mehanizmu i namjenskoj e-pošti: hematologija@mpgi.hr Indikatori: Realizirani konzultacijski sastanci		Metoda informiranja i angažiranja dionika: organiziranje prezentacije ključnih informacija iz glavnog/izvedbenog projekta djelatnicima vrtića i roditeljima u suradnji s ravnateljicom vrtića; javna obavijest o početku izvođenja radova. Indikatori: očekivani neizravni doseg svih roditelja i djece				
	OSTALE USTANOVE	Dom za starije i nemoćne "Dom zaklade Lavoslava Schwartza"	Pitanja sigurnosti starijih i nemoćnih osoba u prometu i pitanja okoliša (buka, prašina...) tijekom građevinskih radova	Metoda informiranja i angažiranja dionika: • informacije objavljene na web stranici Projekta i namjenskoj e-pošti: hematologija@mpgi.hr • savjetovanje s ravnateljicom ili medicinskim osobljem doma za starije i nemoćne • informacije o raspoloživom žalbenom mehanizmu Indikatori: Realizirani konzultacijski sastanci		Metoda informiranja i angažiranja dionika: obavijest ravnateljici i zdravstvenom osoblju doma za umirovljenike; javna obavijest o početku izvođenja radova. Indikatori: očekivani neizravni doseg svih štićenika doma umirovljenika	Nakon izrade glavnog/izvedbenog projekta			
	PROMET I JAVNI PRIJEVOZ	ZET - lokalna autobusna linija	Interes za protočnost prometa tijekom građevinskih radova i moguća poboljšanja kroz realizaciju Projekta	Metoda informiranja i angažiranja dionika: • informacije objavljene na web stranici Projekta • razgovor s upravom ZET-a • informacije o dostupnom žalbenom mehanizmu (koji se može podijeliti s korisnicima njihove usluge) i namjenskoj e-pošti: hematologija@mpgi.hr Indikatori: Realizirani konzultacijski sastanak		Metoda informiranja i angažiranja dionika: otkrivanje ključnih informacija iz glavnog / izvedbenog projekta putem e-pošte sudionicima iz prethodne faze konzultacija; zajednički podaci iz studije o privremenoj organizaciji prometa; javna obavijest o početku izvođenja radova. Pokazatelji: informacije podijeljene na 4-5 adresa e-pošte	Nakon izrade glavnog/izvedbenog projekta			

IZVJEŠĆE O PROVEDBI OKOLIŠNIH I DRUŠTVENIH MJERA ZA DOSAD PROVEDEN RADOVE  
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb  
**Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (P173998)**

		Vozači TAXI-ja	Interes za protočnost prometa tijekom građevinskih radova i moguća poboljšanja kroz realizaciju Projekta	Metoda informiranja i angažiranja dionika: • informacije objavljene na web stranici Projekta • intervjui s vozačima taxi-ja ili s udruženjem taxista • informacije o dostupnom žalbenom mehanizmu (koji se može podijeliti s korisnicima njihove usluge) i namjenskoj e-pošti: hematologija@mpgi.hr Indikatori: Realizirani konzultacijski sastanak						
OSTALI ZAINTERESIRANI DIONICI	OSTALI STANOVNICI GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR	Ostali stanovnici gradske četvrti Maksimir (zainteresirani za temu)	Zainteresiranost za normalno funkcioniranje bolnice tijekom izvođenja građevinskih radova Moguće poteškoće u odvijanju prometa	Metoda informiranja dionika: • informacije objavljene na web stranici Projekta • komunikacija preko predstavnika gradske četvrti Maksimir ili obavijesti na oglasnoj ploči gradske četvrti Maksimir Metoda angažiranja dionika: • konzultacije s vijećem Gradske četvrti • javno izlaganje za vijeće Gradske četvrti • informacije o dostupnom žalbenom mehanizmu i namjenskoj e-pošti: hematologija@mpgi.hr Indikatori: realizirani sastanci s predstavnicima gradske četvrti Maksimir (2-3) ili izravna komunikacija s 5-6 građana	Metoda informiranja i angažiranja dionika: • otkrivanje ključnih informacija iz glavnog/izvedbenog projekta putem e-pošte sudionicima iz prethodne faze konzultacija • obavijest o početku radova i privremenoj regulaciji prometa na oglasnoj ploči gradske četvrti Maksimir Indikatori: neizravan domet informacija građanima	Nakon izrade glavnog/izvedbenog projekta				



IZVJEŠĆE O PROVEDBI OKOLIŠNIH I DRUŠTVENIH MJERA ZA DOSAD PROVEDEN RADOVE  
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb  
**Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (P173998)**

	GRAD ZAGREB	Grad Zagreb	Važnost funkcioniranja bolnica tijekom građevinskih radova	Metoda informiranja i angažiranja dionika: • informacije objavljene na web stranici Projekta • razgovori i konzultacije s nadležnom službom gradske uprave • informacije o dostupnom žalbenom mehanizmu (koji se može podijeliti s građanima) i namjenskoj e-pošti: hematologija@mpgi.hr Indikatori: realizirani konzultativni sastanci		Metoda informiranja i angažiranja dionika: otkrivanje ključnih informacija iz glavnog/izvedbenog projekta putem e-pošte sudionicima iz prethodne faze konzultacija	Nakon izrade glavnog/izvedbenog projekta			
	OSTALI	Nevladine organizacije i udruge građana (usmjerene na okoliš i zdravstvo)	Zabrinutost zbog mogućeg ugrožavanja zdravlja pacijenata, građana i prirode (prioritetne zelene površine) tijekom izvođenja građevinskih radova Zainteresiranost za funkcioniranje bolnice tijekom građevinskih radova i nakon završetka izgradnje	Metoda informiranja dionika: • informacije objavljene na web stranici Projekta • informacije o dostupnom žalbenom mehanizmu (koje mogu podijeliti i sa svojim članovima) i namjenskoj e-pošti: hematologija@mpgi.hr Metoda angažiranja dionika: • intervju i konzultacije		Metoda informiranja i angažiranja dionika: • otkrivanje ključnih informacija iz glavnog/izvedbenog projekta putem e-pošte sudionicima iz prethodne faze konzultacija • organizacija prezentacije glavnog projekta u slučaju iskazanog interesa sudionika iz prethodne faze savjetovanja Indikatori: informacije podijeljene na najmanje 5-6 adresa e-pošte	Nakon izrade glavnog/izvedbenog projekta			
		Projektne radnice	Zabrinutost oko: sigurnosti i zdravlja na radu; kodeks ponašanja; neprihvatljivost rodno uvjetovanog nasilja, seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja te seksualnog uznemiravanja; mehanizam za rješavanje pritužbi na radnom mjestu; mjere opreza pri gospodarenju otpadom.			Metoda informiranja i angažiranja dionika: • EHS izvješća iz ugovorne tvrtke; • informacije objavljene na web stranici Projekta, uključujući informacije o dostupnom žalbenom mehanizmu i namjenskoj e-pošti: hematologija@mpgi.hr Indikatori: pravovremena dostava izvješća građevinske tvrtke	Tijekom građevinskih radova			Izvođač građevinskih radova i tim za društvena pitanja JPP-a

IZVJEŠĆE O PROVEDBI OKOLIŠNIH I DRUŠTVENIH MJERA ZA DOSAD PROVEDEN RADOVE  
 za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb  
**Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (P173998)**


		Mediji/Novinari	Zabrinutost zbog: otkrivanja informacija o aktivnostima Projekta građanima; točno prezentirane informacije o potprojektu.	Metoda informiranja i angažiranja dionika: •informacije objavljene na web stranici Projekta • informacije o raspoloživom žalbenom mehanizmu • poziv na javno predstavljanje konferencije za novinare • priopćenje za tisak	studen 2022 - ožujak 2023	Metoda informiranja i angažiranja dionika: • priopćenja za tisak • izjave • intervjui • pozivnice na događanja sa dodanim medijskim sažetcima • informacije objavljene na web stranici Projekta, uključujući informacije o dostupnom žalbenom mehanizmu i namjenskoj e-pošti: hematologija@mpgi.hr Indikatori: informacija o potprojektu objavljena u najmanje 4-5 medija	Pokretanje građevinskih radova	Metoda informiranja i angažiranja dionika: • priopćenja za tisak • izjave • intervjui • pozivnice na događanja sa dodanim medijskim sažetcima • informacije objavljene na web stranici Projekta Indikatori: praćenje događaja iz najmanje 4-5 medija	Nakon završetka građevinskih radova	Tim za društvena pitanja JPP-a
--	--	-----------------	---	--	---------------------------------	---	--------------------------------------	---	--	-----------------------------------

## 6.2 PRILOG 2 – Rezultati ankete


### Organizacija/institucija/klinika/udruga/zaklada iz kojih dolaze

Najviše sudionika dolazi s Klinike za pedijatriju (njih 11), većinom iz Zavoda za hematologiju, onkologiju i transplantaciju koštane srži i Zavoda za hematologiju onkologiju I transplantaciju krvotvornih matičnih stanica. Ostali sudionici dolaze iz OŠ Jordanovac, a zaposleni su kao učitelj/ica osnovne škole u bolnici (njih troje), jedna sudionica dolazi iz Zaklade dječje onkologije Rebro, a za jednu je ispitanicu nepoznato.

Organizacija/institucija/klinika/udruga/zaklada.



### Njihova funkcija/pozicija

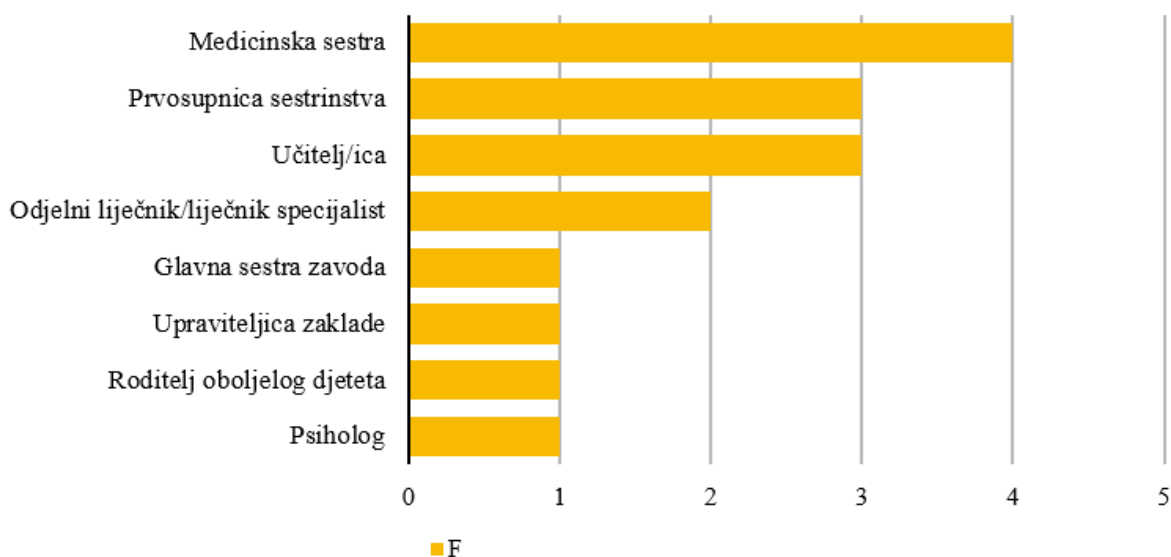


## Način na koji su sudionici bili uključeni u osmišljavanje novih sadržaja i funkcionalnosti u svrhu poboljšanja funkcioniranja klinike

**Najviše je sudionika** u osmišljavanju novih sadržaja i funkcionalnosti u svrhu poboljšanja funkcioniranja klinike bilo uključeno **kroz timske konzultacije** (njih 10). Troje je bilo uključeno i kroz timske i kroz individualne konzultacije, a samo dvije koji su bili uključeni isključivo kroz individualne konzultacije. Kao ostale načine na koji su bili uključeni (njih 3) u osmišljavanje novih sadržaja i funkcionalnosti u svrhu poboljšanja funkcioniranja klinike, sudionici navode:

- 1) “U više navrata mi je bio prezentiran projekt uređenja novih prostora Zavoda na četvrtom katu Klinike za pedijatriju od strane pročelnika Zavoda I glavne sestre Zavoda.” (1)
- 2) “Sudjelovanje u radio emisiji sa voditeljicom zaklade za izgradnju novog odjela.” (1)
- 3) “Učitelj se kontaktiralo o potrebama Škole u bolnici.” (1)

Način na koji su sudionici bili uključeni u osmišljavanje novih sadržaja i funkcionalnosti u svrhu poboljšanja funkcioniranja klinike:



## **Nedostaci postojeće klinike za koje smatraju da će biti otklonjeni kroz nove sadržaje i funkcionalnosti**

Kroz nove sadržaje i funkcionalnosti sudionici očekuju da će se ostvariti:

### **1) MOGUĆNOST BORAVKA RODITELJA UZ DIJETE (12 sudionika)**

Nekoliko primjera:

- “Roditelj će moći biti uz svoje dijete cijelo vrijeme i dijete će biti u obiteljskom okruženju.”
- “Kapaciteti sadašnjeg zavoda nema mogućnosti boravka roditelja uz dijete.”
- “Mogućnost boravka roditelja uz dijete 24 sata dnevno, što smatram neophodnim za psihičku ravnotežu malih pacijenata s obzirom na dugotrajnost liječenja.”
- “Bolji prostorni i smještajni uvjeti - sobe koje su jednokrevetne/dvokrevetne, koje omogućuju smještaj roditelja/skrbnika.”

### **2) BOLJI UVJETI ZA IZVOĐENJE NASTAVE I NASTAVNIKE (11 sudionika)**

Nekoliko primjera:

- “Škola u bolnici dobila bi prostor za organizaciju nastave, poučavanje i održavanje konzultacija s roditeljima.”
- “Smatram da će Klinika moći osigurati zasebne prostorije za potrebe nastave te prostor za presvlačenje i odlaganje stvari djelatnika škole.”
- “Otklonit će se nedostatak zasebnih prostora (učionica) za poučavanje učenika.”
- “Povećat će se - prostor na zidovima Zavoda za izlaganje učeničkih radova i edukativno-informativnih materijala.”

### **3) SANITARNI ČVOR U SVAKOJ SOBI GDJE ĆE BORAVITI RODITELJI S DJECOM (8 sudionika)**

Nekoliko primjera:

- “Sanitarni čvor za svaku sobu, odnosno svakog pacijenta, zbog minimiziranja izloženosti infekcijama kojima su mali pacijenti vrlo podložni.”
- “Sanitarni čvor za roditelje u sklopu odjela, također zbog minimiziranja izloženosti infekcijama. Nedopustivo je da roditelji čija se djeca liječe na ZHO moraju koristiti toalet koji koriste stotine posjetitelja KBC-a.”

### **4) ADEKVATAN PROSTOR ZA OSOBLJE, BOLJI RADNI UVJETI POTREBNA OPREMA (7 sudionika)**

Nekoliko primjera:

- “Nedostatak potrebnih medicinskih aparata.”
- “Nema garderobe za medicinske sestre.”
- “Nema dovoljno kapaciteta za organizaciju posla.”
- “Adekvatan prostor za osoblje.”



**5) MOGUĆNOST BORAVAK MAKSIMALNO DVA DJETETA PO SOBI (4 sudionika)**

Nekoliko primjera:

- “Bolji, komforniji prostor i boravak jednog do maksimalno dva djeteta po sobi - unaprjeđenje sterilnosti cjelokupnog odjela.”
- “Broj pacijenata u sobi (jedno dijete = jedna soba).”

**6) SPAJANJE TRANSPLATACIJSKOG ODJELA S POSTOJEĆIM ODJELOM I POVEĆANJE BROJA STERILNIH JEDINICA KAO OSNOVE LIJEČENJA TRANSPLATACIJOM KOŠTANE SRŽI (4 sudionika)**

Nekoliko primjera:

- “Na postojećoj Klinici, Odjel je odvojen od odjela za transplantaciju, a novim odjelom će biti zajedno što će nam uvelike olakšati rad i brigu o našim pacijentima.”
- “Bit će izgrađene sterilne jedinice za provođenje transplantacije krvotvornih matičnih stanica, a koji su sada dostupni jedino u Zavodu za hematologiju Klinike za unutarnje bolesti.”
- “Povećanje broja sterilnih jedinica kao osnove liječenja transplantacijom koštane srži.”

**7) POVEĆANJE POTREBITOG PROSTORA (4 sudionika)**

Nekoliko primjera:

- “Nedostatak prostora za potrebne psihosocijalne i rehabilitacijske mjere tijekom boravka.”
- “Nedostatak prostora koji utječe na nepovoljniju epidemiološku situaciju zbog potrebe smještaja više djece u istu sobu.”
- “Prostor za fizikalnu terapiju djece, sterilne jedinice.”
- “Veći prostor, više svjetlosti.”

**8) OSTALI SADRŽAJI KOJI ĆE DOPRINIJETI OLAKŠAVANJU PRILAGODBE DJECE NA DUGU HOSPITALIZACIJU I LIJEČENJE (4 sudionika)**

Nekoliko primjera:

- “Dječja igraonica prilagođena dobi, prostor za igru radnu terapiju za predškolce i za adolescente.”
- “Sve treba biti oslikano i prilagođeno dječjoj dobi (zidovi soba i hodnici Zavoda, po mogućnosti određena medicinska oprema), a u cilju olakšavanja prilagodbe na dugu hospitalizaciju i liječenje malignih bolesti.”
- “Veći prostori za djecu.”

**9) OSIGURAVANJE PRIVATNOSTI ZA VRIJEME INTENZIVNOG LIJEČENJA DJETETA (3 sudionika)**

Nekoliko primjera:

- “Osigurana privatnost uslijed gubitka kose i promjene izgleda zbog intenzivnog liječenja u odnosu na sadašnju lokaciju odjela.”
- “Pravovaljana izolacija djece s oslabljenim imunološkim sustavom je manje izvediva obzirom na postojeću infrastrukturu.”
- “Nedostatak privatnosti jer čim otvorimo prozor prolaznici nam vide u sobu.”

**10) PREMJEŠTANJE ODJELA-ZAVODA NA ADEKVATNIJE MJESTO (2 sudionika)**

Nekoliko primjera:

- “Problem smještaja odjela-zavoda u prizemlju blizina zemlje i ispušnih ventila od klima uređaja nuklearne medicine i ostaloga.”
- “Lokacija odjela (sadašnja lokacija je na vjerojatno najgorem mogućem mjestu – tik uz glavni ulaz gdje je velika frekvencija pacijenata i osoblja, kao i vozila čiji ispušni plinovi sigurno ne doprinose izlječenju naše djece.”

**11) TERASA ZA IZLAZAK NA SVJEŽI ZRAK (1 sudionik)**

**12) ČAJNA KUHINJA ZA RODITELJE UZ MOGUĆNOST PRIPREME OBROKA (1 sudionik)**


**13) PROSTOR ZA DEZINFEKCIJU INVENTARA (1 sudionik)**

**14) ADEKVATAN PROSTOR ZA PRIPREMU TERAPIJA (1 sudionik)**

**15) VODA I ZRAK ĆE BITI PROČIŠĆENI TE ĆE TIME ZAŠTITA OD INFEKCIJA BITINA VISOKOM STUPNJU (1 sudionik)**

IZVJEŠĆE O PROVEDBI OKOLIŠNIH I DRUŠTVENIH MJERA ZA DOSAD PROVEDEN RADOVE  
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb  
Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (P173998)

■ F Kroz nove sadržaje i funkcionalnosti sudionici očekuju da će se ostvariti:

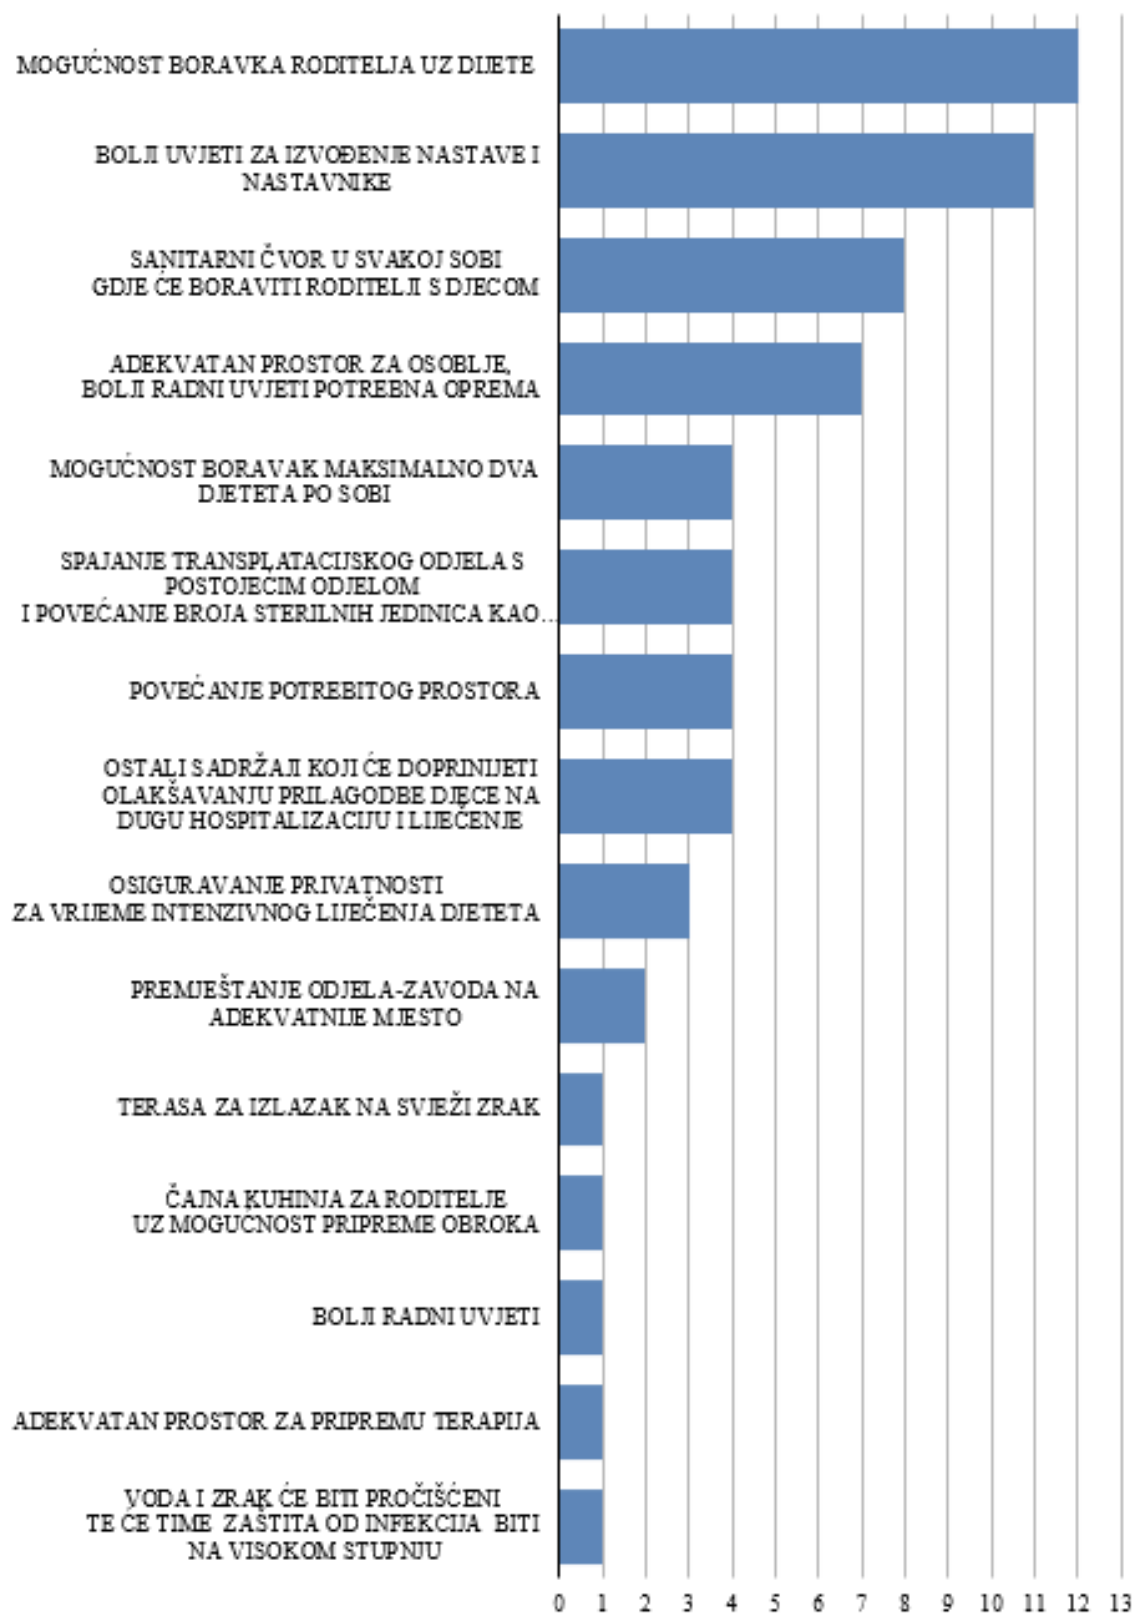

**Dosadašnji prijedlozi i sugestije sudionika s ciljem poboljšanja postojećih ili uvođenja novih sadržaja i funkcionalnosti**

Prijedloge i sugestije sudionika koje su naveli u anketi podijelili smo u kategorije (vidi tablicu ispod).

<b>SOBE ZA PACIJENTE (DJECU)</b>	<b>N 19</b>	<b>NASTAVA</b>	<b>N 11</b>	<b>POTREBNA OPREMA</b>	<b>N 7</b>	<b>ZASEBNI PROSTORI POTREBNI ZA PRIPREMU I LIJEČENJE</b>	<b>N 6</b>
PREMJEŠTANJE ZAVODA DJEČJE HEMATOLOGIJE NA ADEKVATNIJE MJESTO KAKO BI SE DJECI OSIGURALA PRIVATNOST	1	ZASEBNI PROSTOR - UČIONICA +IGRAONICA	1	AUDIO I VIDEO NADZOR	4	MIKROBIOLOŠKO ZAŠTITNI KABINET ZA PRIPREMANJE TERAPIJE I OTOPINA	1
OPREMANJE BOLESNIČKIH SOBA ZA MOGUĆNOST ODVIJANJA NASTAVE U SOBI	1	ZASEBNI PROSTOR - UČIONICA	4	ADEKVATNA VENTILACIJA	1	PROSTOR ZA DEZINFEKCIJU	1
SOBE KOJE PRUŽAJU MOGUĆNOST BORAVKA RODITELJA UZ DJECU	5	ZASEBNI PROSTOR ZA UČITELJE; ODLAGANJE NASTAVNIH MATERIJALA I KONZULTACIJE UČITELJA I RODITELJA	5	NOVIM MODERNIM UREĐAJIMA	2	PROSTOR ZA FIZIOTERAPIJU	1
POBOLJŠATI KVALITETU SOBA	1	BOLJA OPREMLJENOST UČIONICE	1			POVEĆATI I BOLJE OPREMITI SOBU ZA ZAHVATE	1
POVEĆATI BROJ SOBA RADI MANJEG BROJA DJECE U SOBAMA	4					PROSTOR ZA RAZRIJEĐIVANJE TERAPIJE	1

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI OKOLIŠNIH I DRUŠTVENIH MJERA ZA DOSAD PROVEDEN RADOVE**  
 za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb  
**Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (P173998)**

POTREBNO JE DA SVAKA SOBA IMA SANITARNI ČVOR	5					POVEĆATI BROJ LIJEČNIČKIH SOBA RADI BOLJE PRODUKTIVNOST DJELATNIKA	1
KUHINJA ZA PRIPREMU OBROKA DJETETU	2						

<b>PREMJEŠTANJE ZAVODA DJEČJE HEMATOLOGIJE NA ADEKVATNIJE MJESTO KAKO BI SE DJECI OSIGURALA PRIVATNOST</b>	<b>N</b>	<b>4</b>	<b>NAPRAVITI IZGLEDOM I SADRŽAJEM VESELJI PROSTOR</b>	<b>N</b>	<b>3</b>	<b>VEĆA I FUNKCIONALNIJA IGRAONICA</b>	<b>N</b>	<b>3</b>	<b>VANJSKA OGRAĐENA TERASA</b>	<b>N</b>	<b>3</b>
--	----------	----------	---	----------	----------	--	----------	----------	--------------------------------	----------	----------

<b>GARDEROBA ZA MEDICINSKE SESTRE</b>	<b>N</b>	<b>3</b>	<b>SOBA ZA PSIHOLOŠKU SLUŽBU</b>	<b>N</b>	<b>2</b>	<b>PROSTOR ZA RODITELJE</b>	<b>N</b>	<b>1</b>	<b>PROSTOR ZA RODITELJE</b>	<b>N</b>	<b>1</b>
---------------------------------------	----------	----------	----------------------------------	----------	----------	-----------------------------	----------	----------	-----------------------------	----------	----------



### Nedostaci postojeće klinike za koje smatraju da neće moći biti otklonjeni čak ni kroz nove funkcionalnosti

Nedostaci postojeće klinike za koje smatraju da neće moći biti otklonjeni čak ni kroz nove funkcionalnosti	N
Smatram da će svi nedostaci biti otklonjeni/ Trenutno ne vidim nedostatke u projektu	5
Udaljenost od radilišta koja su im neophodna za rad (npr. Udaljenost od dijagnostike i transfuzije)	3
Nedostatak stručnog osoblja za sve potrebe naših pacijenata (uključujući i medicinsko i ne medicinsko osoblje)	3
Manjak zapošljavanja tima koji bi bio kontinuirano zadužen za psihosocijalno zbrinjavanje hospitalizirane djece (psiholog, socijalni pedagog, socijalni radnik, radni terapeut)	2
Ponekad i uz dobre organizacijske vještine i suvremen pristup nismo u mogućnosti zadani cilj sprovesti do kraja. Ne misleći pri tome na kvalitetu pružane skrbi oboljelima i njihovim obiteljima. Mišljenja sam da zajedničko težeći ka boljem i suvremenijem, prepreke koje stanu na put u tom trenu će biti lakše uklonjive.	1

Osim toga, komentari po ovom pitanju bili su i sljedeći:

*“Mišljenja sam da novi zavod neće imati nikakve nedostatke u odnosu na stari. jedini nedostatak vidim u nedostatku medicinskog osoblja, ali to nažalost ne možemo predvidjeti i ne ovisi o nama. No, smatram da nova klinika nudi i nove prilike koje će zasigurno doprinijeti i dati veći prostor za napredak u učenju i liječenju bolesti djece s malignim oboljenjima, a samim time i veći postotak izliječenja. “*

*“Zadovoljstvo na svim razinama teško je postići jer uvijek idemo prema naprijed i puno se toga još može napraviti. Svaki dan je novi, ono što je danas funkcionalno možda neće biti sutra. Važno je poraditi na ulaganju u ljudske resurse kao što je zadovoljstvo djelatnika i uspostaviti dobre timske odnose “*

*“Nastava za učenike osnovnoškolske dobi provodi se na Zavodu za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju već 31 godinu.*

*Prostorni uvjeti na Zavodu u prošlosti i sada, uz najbolju postojeću volju i trud, ne mogu zadovoljiti zahtjeve u odnosu na organizaciju i provođenje odgojno-obrazovnog rada s učenicima koji se školuju tijekom liječenja.*

*Iskreno se nadam da će u novim prostorima Zavoda biti otklonjivi nedostaci s kojima se u radu s učenicima zbog skučenosti prostora Zavoda sada suočavamo.”*

### 6.3 PRILOG 3 – Pregled diskutiranih pitanja s javnog predstavljanja projekta

Plan upravljanja okolišnim i društvenim rizicima – Kontrolna lista i Izvješće o provedbi okolišnih i društvenih mjera za dosad provedene radove javno su objavljeni na WEB<sup>5</sup> stranici Projekta u razdoblju od dva tjedna (14. veljače – 28. veljače 2023.). Dana 21. veljače 2023. godine u 14 sati. u Velikoj vijećnici Mjesnog odbora Dobri dol na adresi Dobri dol 49 održano je javno predstavljanje projekta novog Zavoda za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju KBC-a Zagreb.

No.	PITANJE/KOMENTAR	ODGOVOR
1.	Predsjednica MO Dobri dol komentira mobilnost na Rebru i ističe da stanovnici imaju ozbiljnih problema s prometom, moli za uključenost u privremenu regulaciju prometa.	Odgovor je pružen od strane stručnjaka za društvena pitanja i voditelja Projekta: Prometna studija će se raditi vezano uz projekt Rebro Faza III, a prometnu studiju radimo jer ju želimo napraviti i jer ju moramo napraviti.
2.	Sudionik iznosi mišljenje da će svaki novi sadržaj koji se dodaje opteretiti promet (i parkiranih vozila i prometa u pokretu).	Stručnjak za društvena pitanja ističe i kako su svi ključni dionici uključeni u sklopu projekta Rebro III te smo uvidjeli da su rješenja potrebna. Prometna studija, kako kaže, ne obuhvaća samo jednu ulicu nego i šire te će ovaj projekt napraviti nešto što bi moglo olakšati cijelu situaciju s prometom - objašnjava rješenje rotora, objašnjava kako će se drop-off zona nalaziti unutar prostora KBC-a te da će ulazak u garažu biti unutar kompleksa što je puno bolja solucija od trenutnog ulaza u garažu koji je na ulici. Zaposlenik KBC-a Rebro komentira kako je odavno upoznat s ovim prostorom te je u zadnje vrijeme primijetio sve veću izgrađenost i problem prikopčavanja na instalacije radi kojih bi se više brinuo nego što ga brine promet.
3.	Zanima me koliko će se povećati kapacitet s novim odjelom?	Pročelnik Zavoda za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju ističe kako se kapacitet neće povećati, već će se pružiti bolji uvjeti.
4.	Koliko se djece liječi godišnje?	Pročelnik Zavoda za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju navodi kako se 150 djece godišnje liječi, od kojih se oko 80 posto se izliječi te godišnje bude 20-ak transplantacija.
5.	Zanima me koji su modeli financiranja osim preko Zaklade?	Voditelj projekta: Zaklada je financirala dio do ovog stanja sad, a ostatak financira Svjetska Banka. Arhitekt: Do ovog stanja sad je financirala zaklada - zatvorena je konstrukcija, vodovod.
6.	Kolika je ukupna vrijednost projekta?	Voditelj projekta: Vrijednost Projekta je oko 3 milijuna eura, to je kredit od Svjetske Banke .

<sup>5</sup> <https://www.oporavak-i-pripravnost.hr/dokumenti/10>

IZVJEŠĆE O PROVEDBI OKOLIŠNIH I DRUŠTVENIH MJERA ZA DOSAD PROVEDEN RADOVE  
za novi Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb  
**Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (P173998)**

---

7.	Zanima me koja agencija stoji iza društvenog aspekta Projekta?	Voditelj projekta i stručnjaci za društvena pitanja: ne stoji nikakva agencija, sami to radimo.
8.	Sudionica daje pohvalu za društveni tim Projekta i uključivanje svih dionika.	
